

MBA EM **GESTÃO**
DE PROJETOS

Execução do projeto

Professor André Ricardi

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

André Ricardi

- Profissional de **Gestão de Projetos, Programas e Portfólios** desde 1994
- Estuda o tema **desde 1986**
- Experiência 40 anos no **setor financeiro, indústria, comércio, serviços e terceiro setor**
- **Analista de Sistemas** e pós-graduado em **Docência no Ensino Superior**
- Professor desde 1986, no **Ensino Superior desde 1998**.
Coordenador de pós-graduação por 10 anos, ... e em **MBA** desde out/23
- Foi VP Operações e Diretor do **PMI São Paulo**.



Agenda

19h00 – 20h10: Como se preparar adequadamente para a Execução

20h10 – 20h25: Intervalo 1

20h25 – 21h35: Como superar os desafios no meio do caminho

21h35 – 21h50: Intervalo 2

21h50 – 23h00: Como Gerenciar Conhecimento e Mudanças






Principais Dificuldades que Você enfrenta para gerenciar seus projetos



Quais são as principais dificuldades para engajar partes interessadas em projetos?

Muitos querendo ser a estrela do jogo

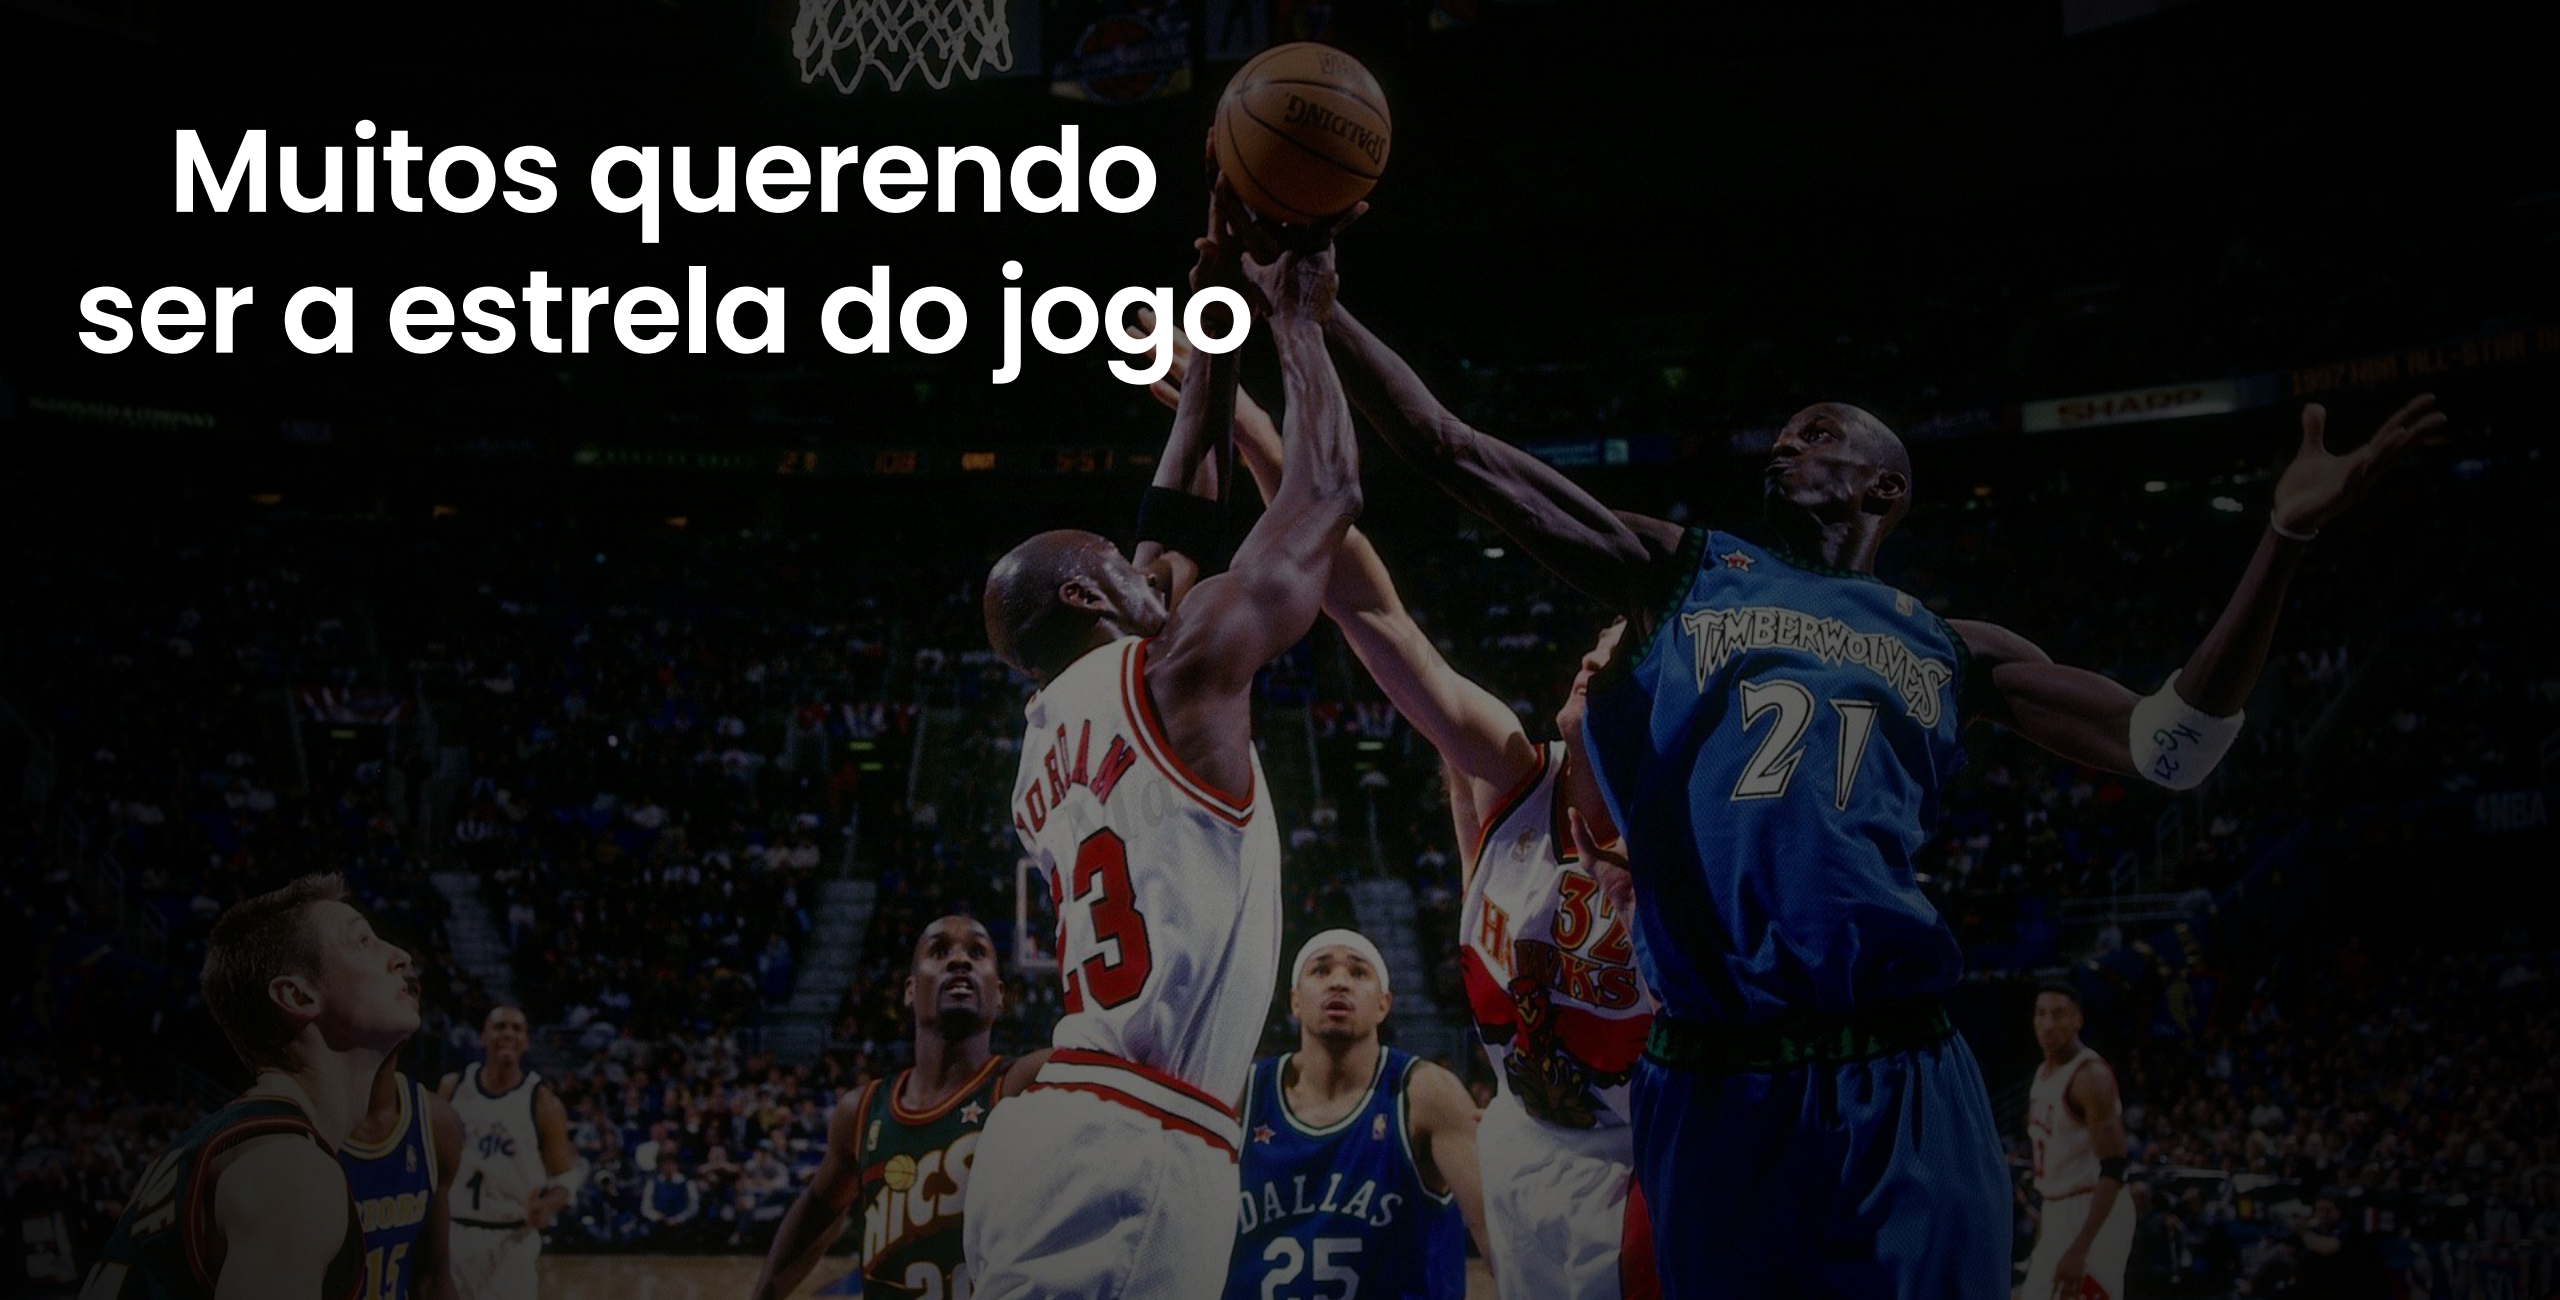

Competição Interna Exagerada





O ambiente vira uma selva



**Desperta o animal que existe
dentro de cada um**



Todos viram,
ou tentam virar,
predadores...



**Mas se esquecem
que estão todos no
mesmo aquário...**

**Mesmo que você vire
um tubarão, um dia a
comida do aquário
vai acabar.**





**Então
como
resolvemos
este
dilema?**

Não está fácil achar pessoas adequadas...





Não se ganha o jogo sozinho...




Falta de compromisso com os resultados e com a empresa



Interesses Pessoais prevalecem sobre os Corporativos ou do Grupo




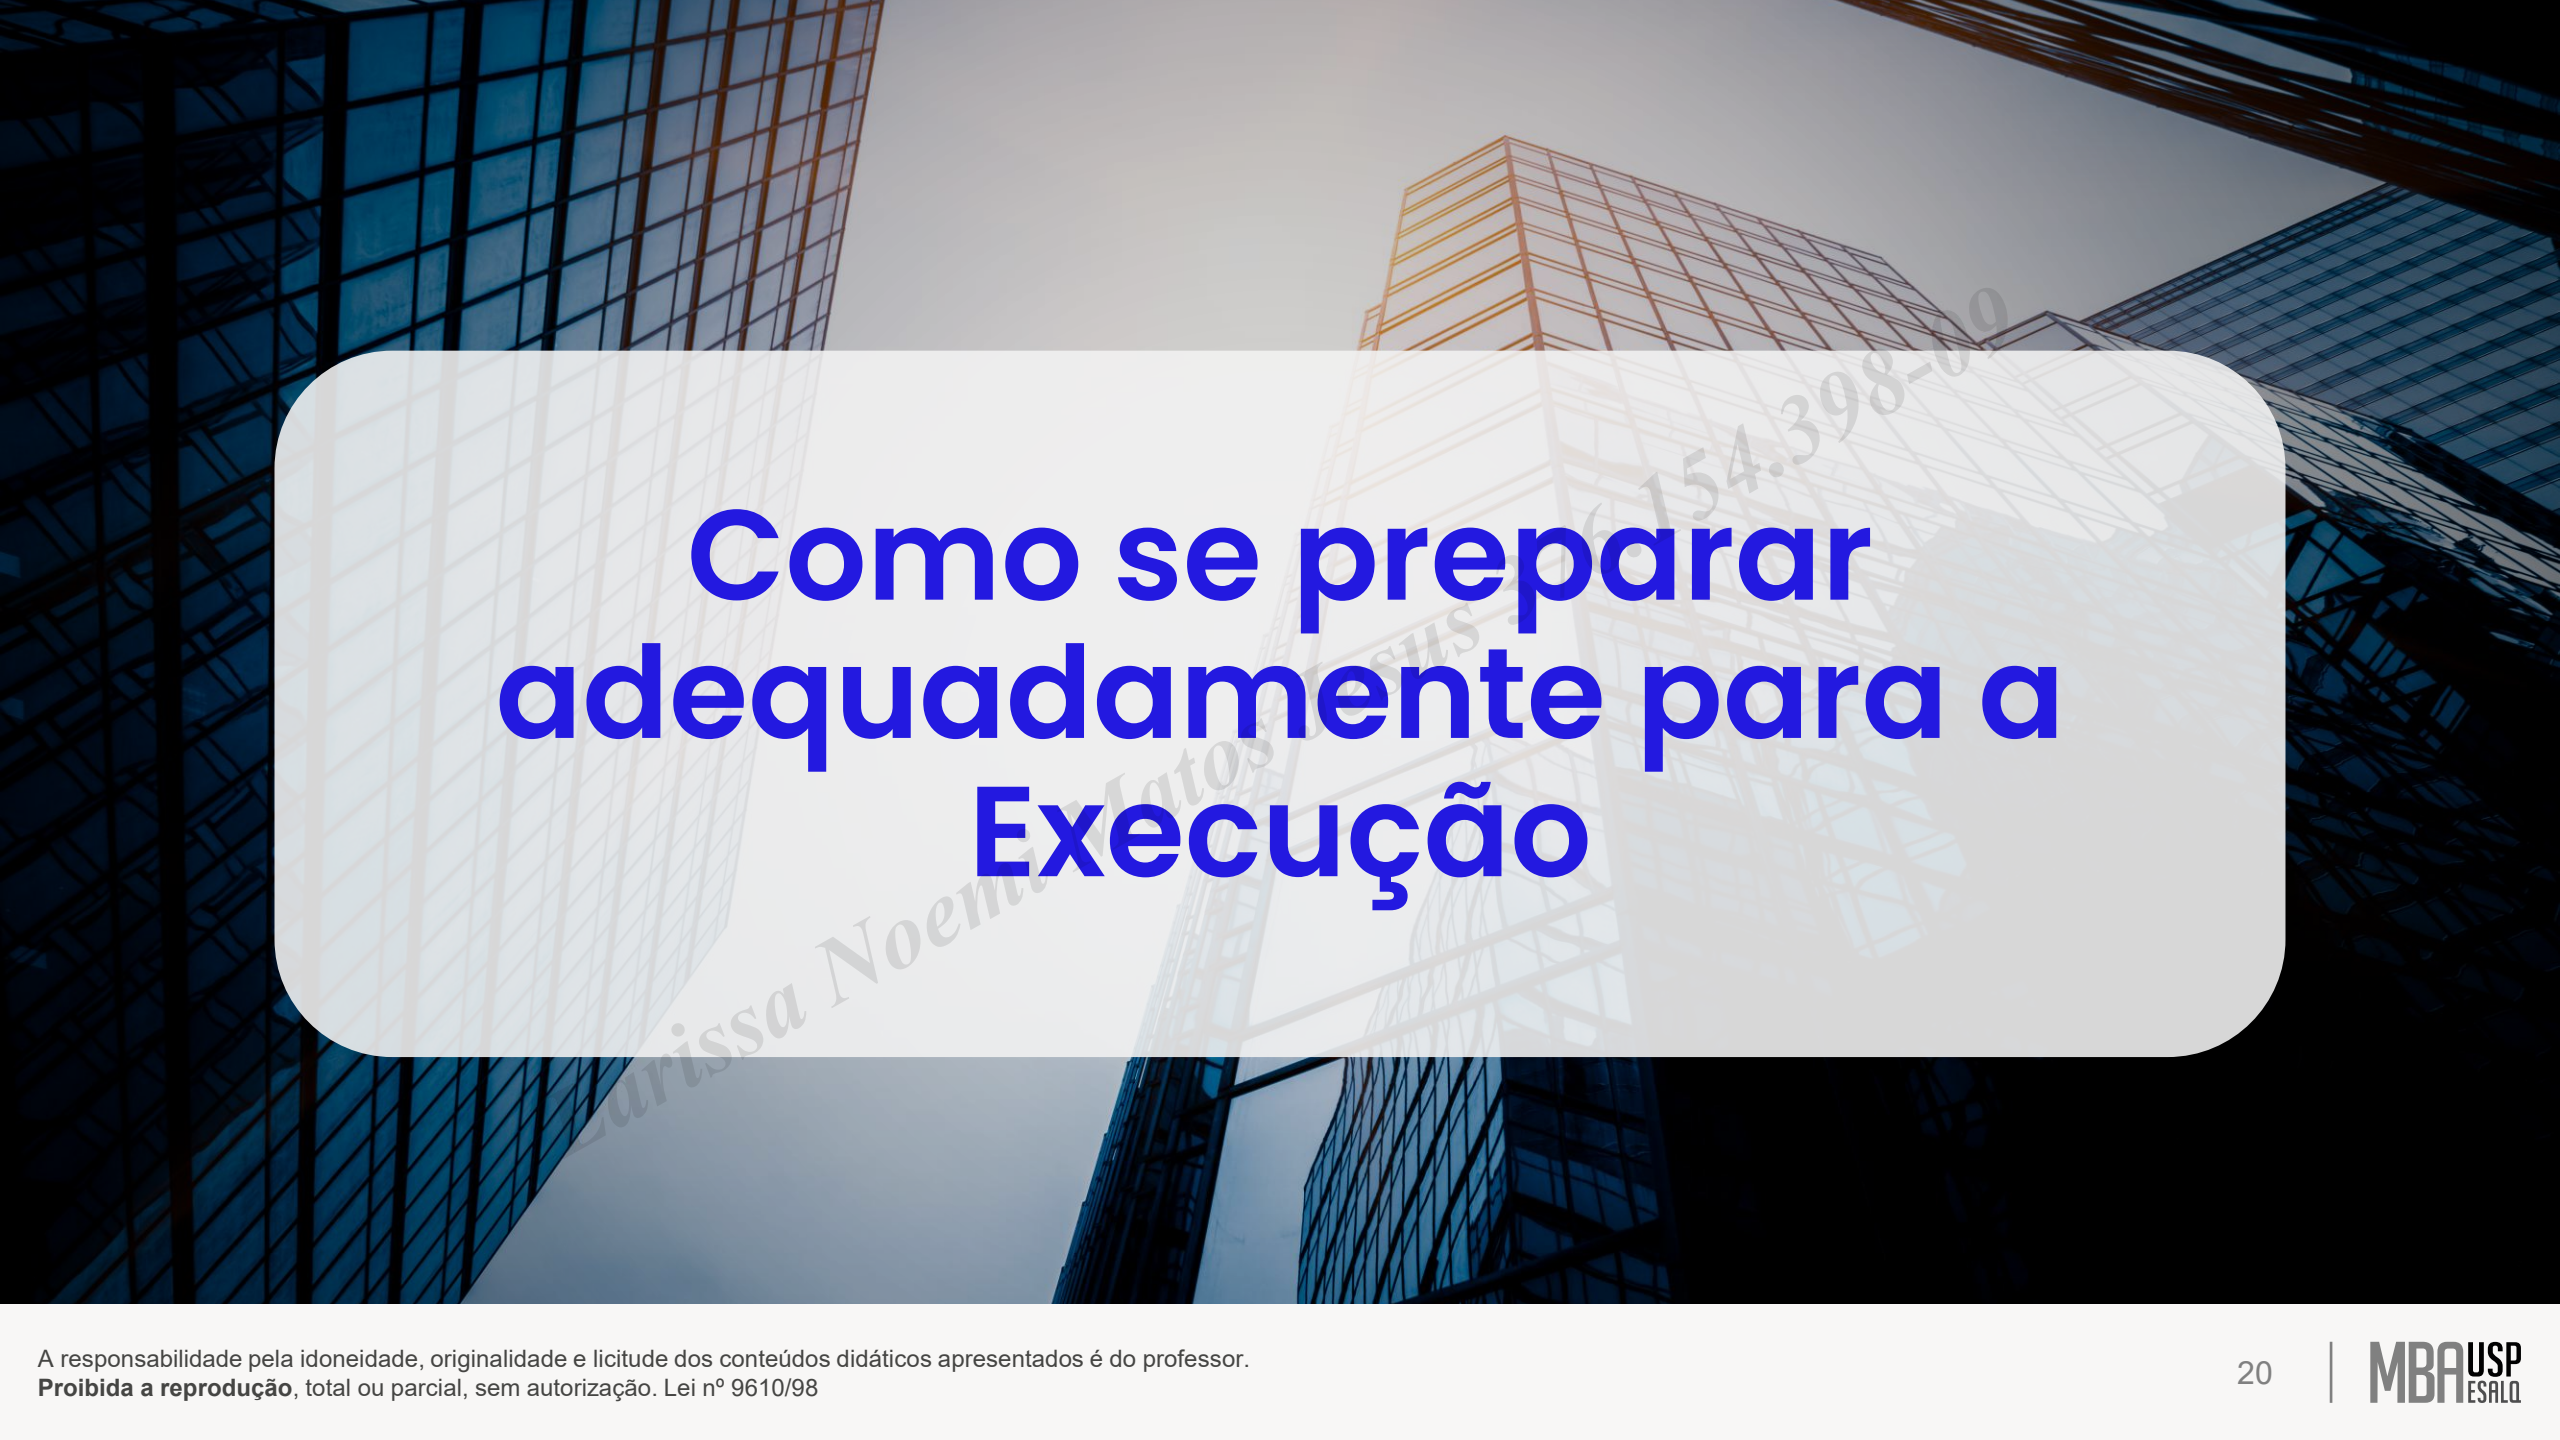

Como se preparar adequadamente para a Execução

Disrupção digital

Adoption of advanced digital technologies will increase by 2026

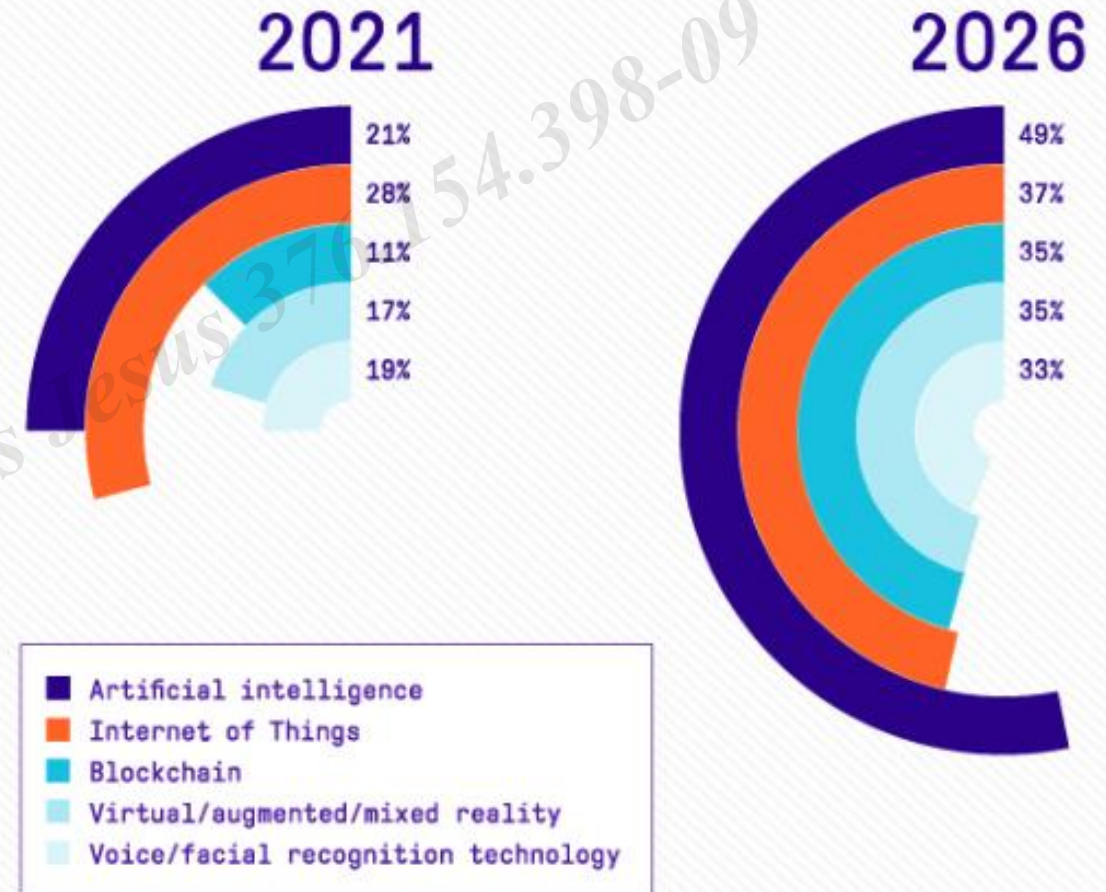

Source: PMI & PwC survey (2021)

Mestre Gugo





Na prática IA PODE:

- *Responder e-mails*
- *Criar apresentações espetaculares*
- *Gerar documentos*
- *Apoio na tomada de decisões*
- *etc.*

E para a gestão de projetos:

1. *Automação de Tarefas Repetitivas*
2. *Análise Preditiva*
3. *Otimização de Recursos*
4. *Geração de Documentos*
5. *Tomada de Decisão Assistida.*





E para a gestão de projetos:

- 6. Comunicação Melhorada**
- 7. Simulações de Projeto**
- 8. Suporte para Reuniões**
- 9. Feedback e Avaliação**
- 10. Aprendizado e Adaptação.**

Execução do Projeto alinhada ao PMBOK 8ª edição.

Processos por Domínios, dentro da Área Foco de Execução:

☐ Governança:

- Gerenciar a Execução do Projeto
- Gerenciar a Garantia da Qualidade
- Gerenciar o Conhecimento do Projeto

☐ Partes Interessadas

- Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas
- Gerenciar as Comunicações

☐ Recursos

- Adquirir Recursos
- Liderar a Equipe


☐ Riscos

- Implementar Respostas aos Riscos

Execução do Projeto (conceitos-chave):

- Gerenciar o desempenho e as mudanças das atividades no plano de gerenciamento do projeto
 - *Como: comparando o resultado da execução com o plano de gerenciamento do projeto, através dos processos de monitoramento e controle.*

(Guia PMBOK®, 2017,p.72)

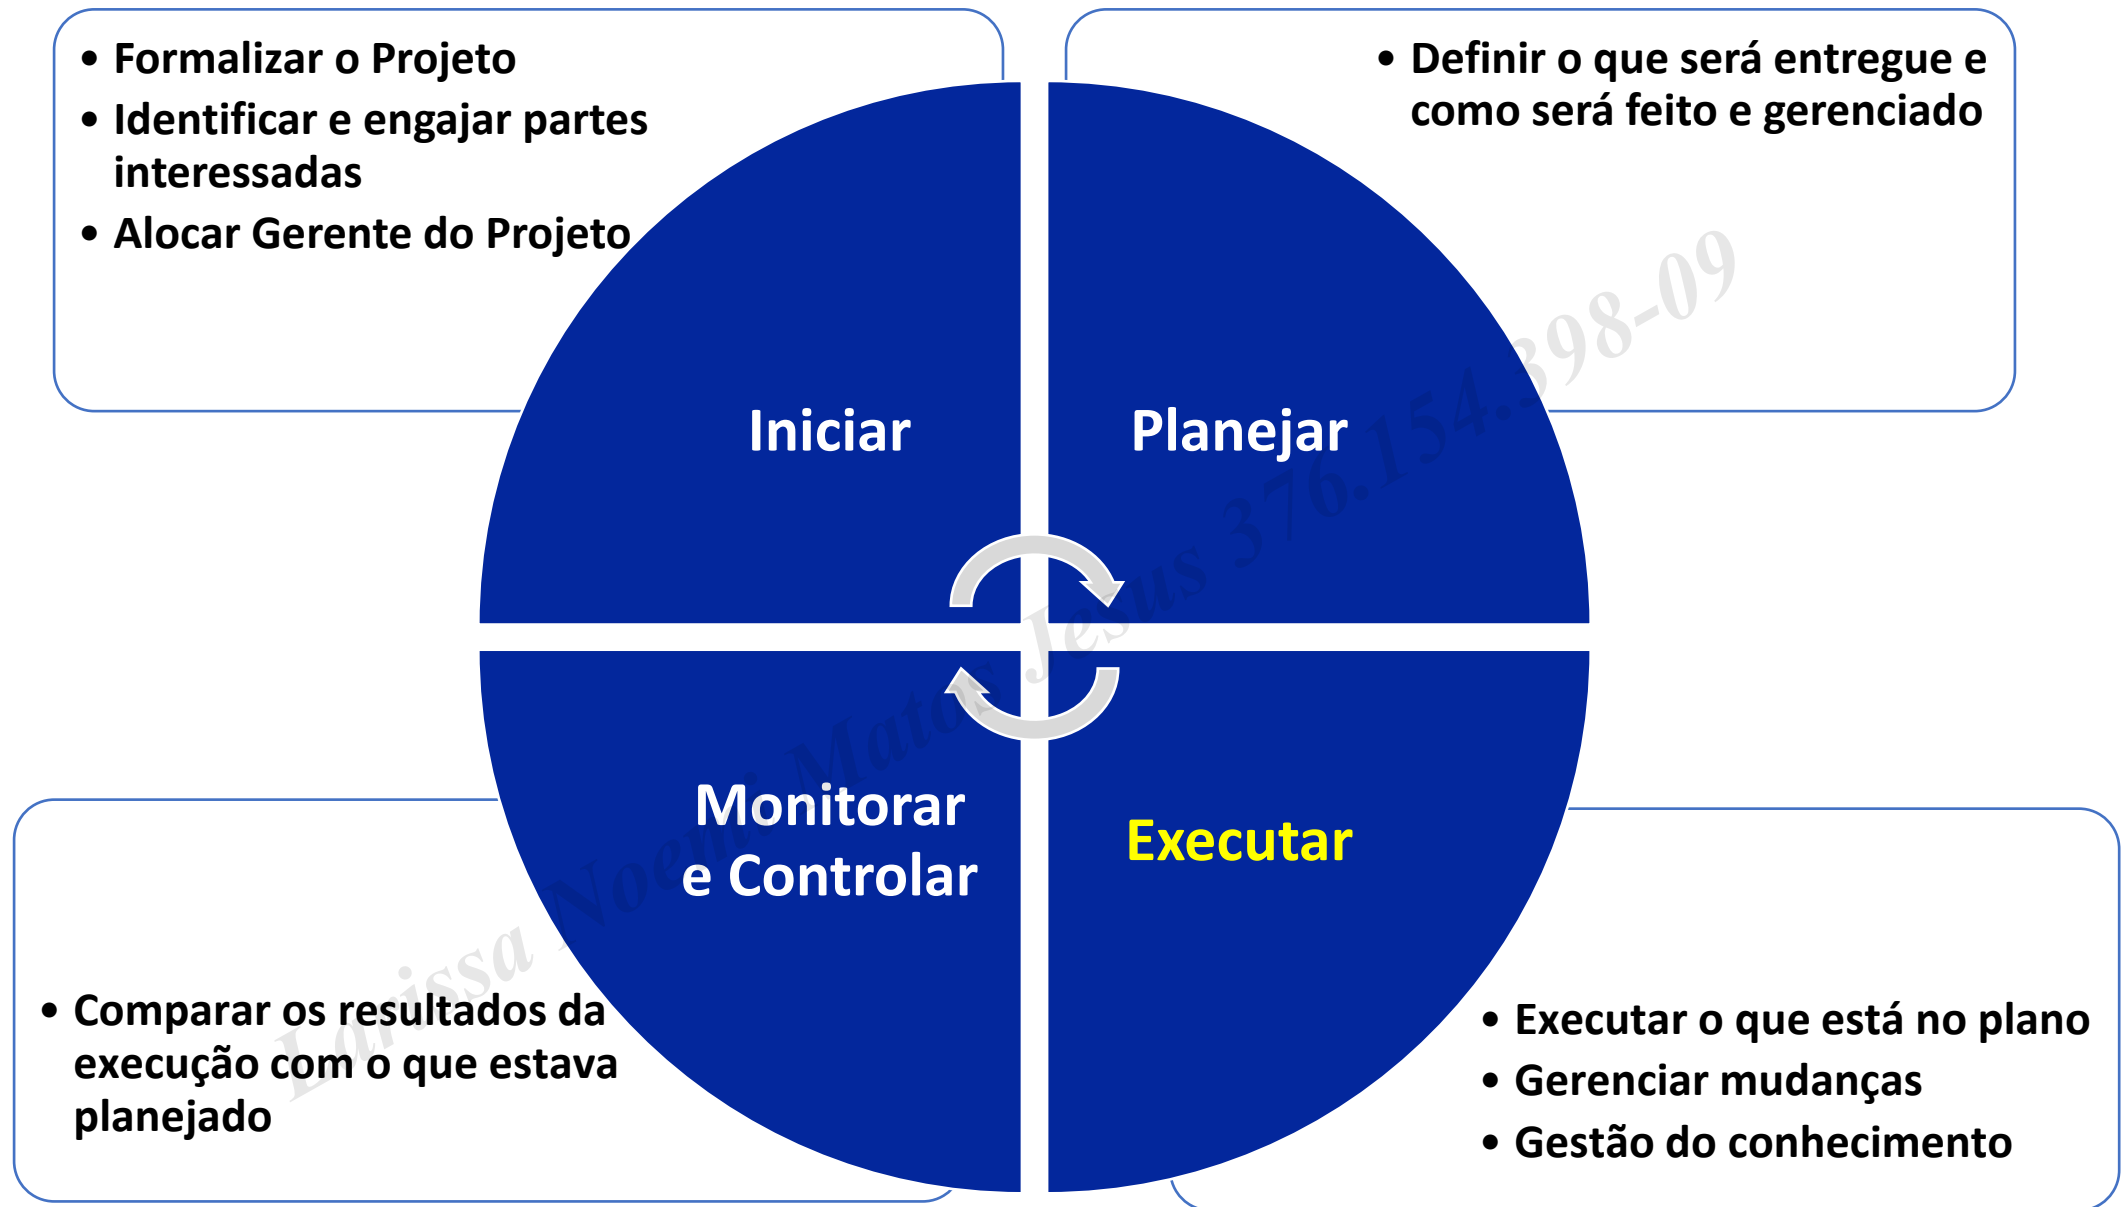

Execução do Projeto (conceitos-chave):

- Assegurar a criação e o uso do conhecimento apropriado de e para o projeto conforme for necessário
 - *Como: através da gestão do conhecimento e o uso de lições aprendidas.*

(Guia PMBOK®, 2017,p.72)

O gerente do projeto é quem combina os resultados em todas as Áreas de Conhecimento e tem a visão geral do projeto.



(Guia PMBOK®, 2017,p.72)

Execução do Projeto (conceitos-chave):

- Tomar decisões integradas em relação às mudanças chave que impactam o projeto
 - *Como: analisando todos os aspectos do projeto, considerando todas as áreas de conhecimento e todos os domínios de desempenho.*

(Guia PMBOK®, 2017,p.72)

O gerente do projeto é responsável pelo projeto como um todo.

(Guia PMBOK®, 2017,p.72)



Maestro !



Execução do Projeto (conceitos-chave):

- Medir e monitorar o progresso do projeto e tomar as medidas necessárias para atender aos seus objetivos
 - *Como: com informações confiáveis e tendo uma postura proativa perante as dificuldades que irão se apresentar.*




(Guia PMBOK®, 2017,p.72)

Quanto mais complexo o projeto e mais diversas as expectativas das partes interessadas, mais complexa é a abordagem necessária à integração.




(Guia PMBOK®, 2017,p.72)

Transição dos Guias básicos?

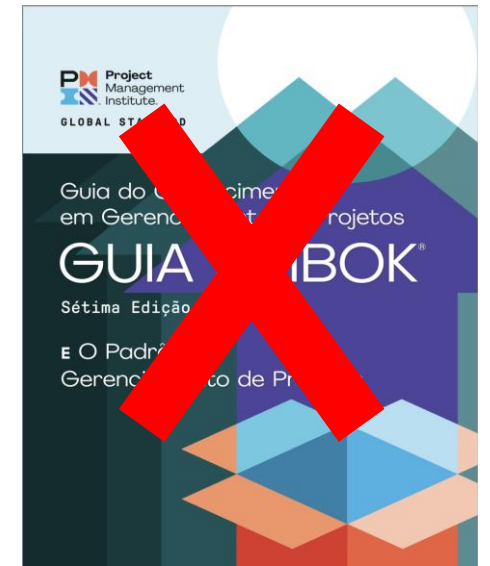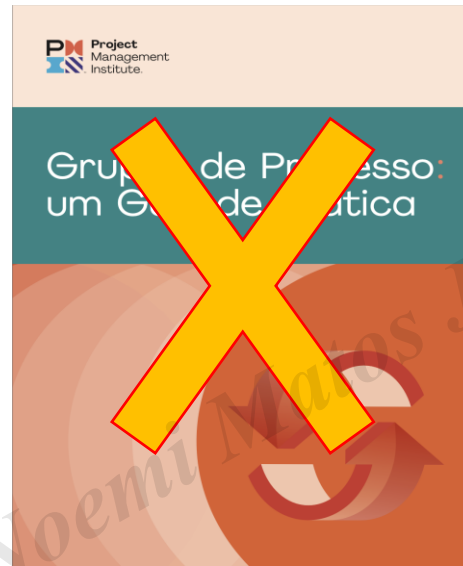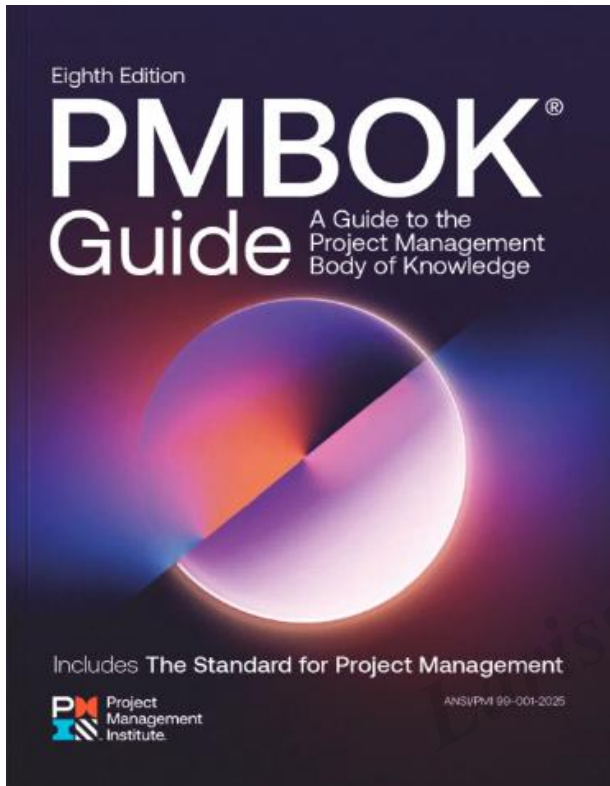

Guia PMBOK® 8ª edição

PMIstandards+

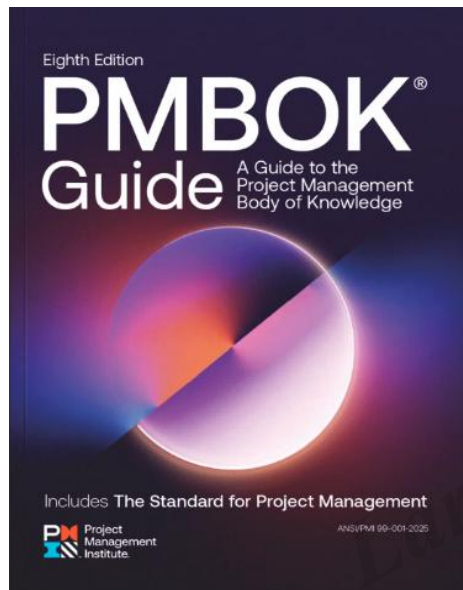

Disponíveis Online



PMIstandards+™





2.1.6.4 Gerenciar a Execução do Projeto

Liderar e realizar o trabalho definido no Plano de Gerenciamento do Projeto e implementar as mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto.

(PMBOK Guide®, 2025, p. 21)

Criar as entregas do projeto para atender o trabalho planejado do projeto




Fornecer, treinar e gerenciar os membros da equipe





Obter, gerenciar e usar recursos

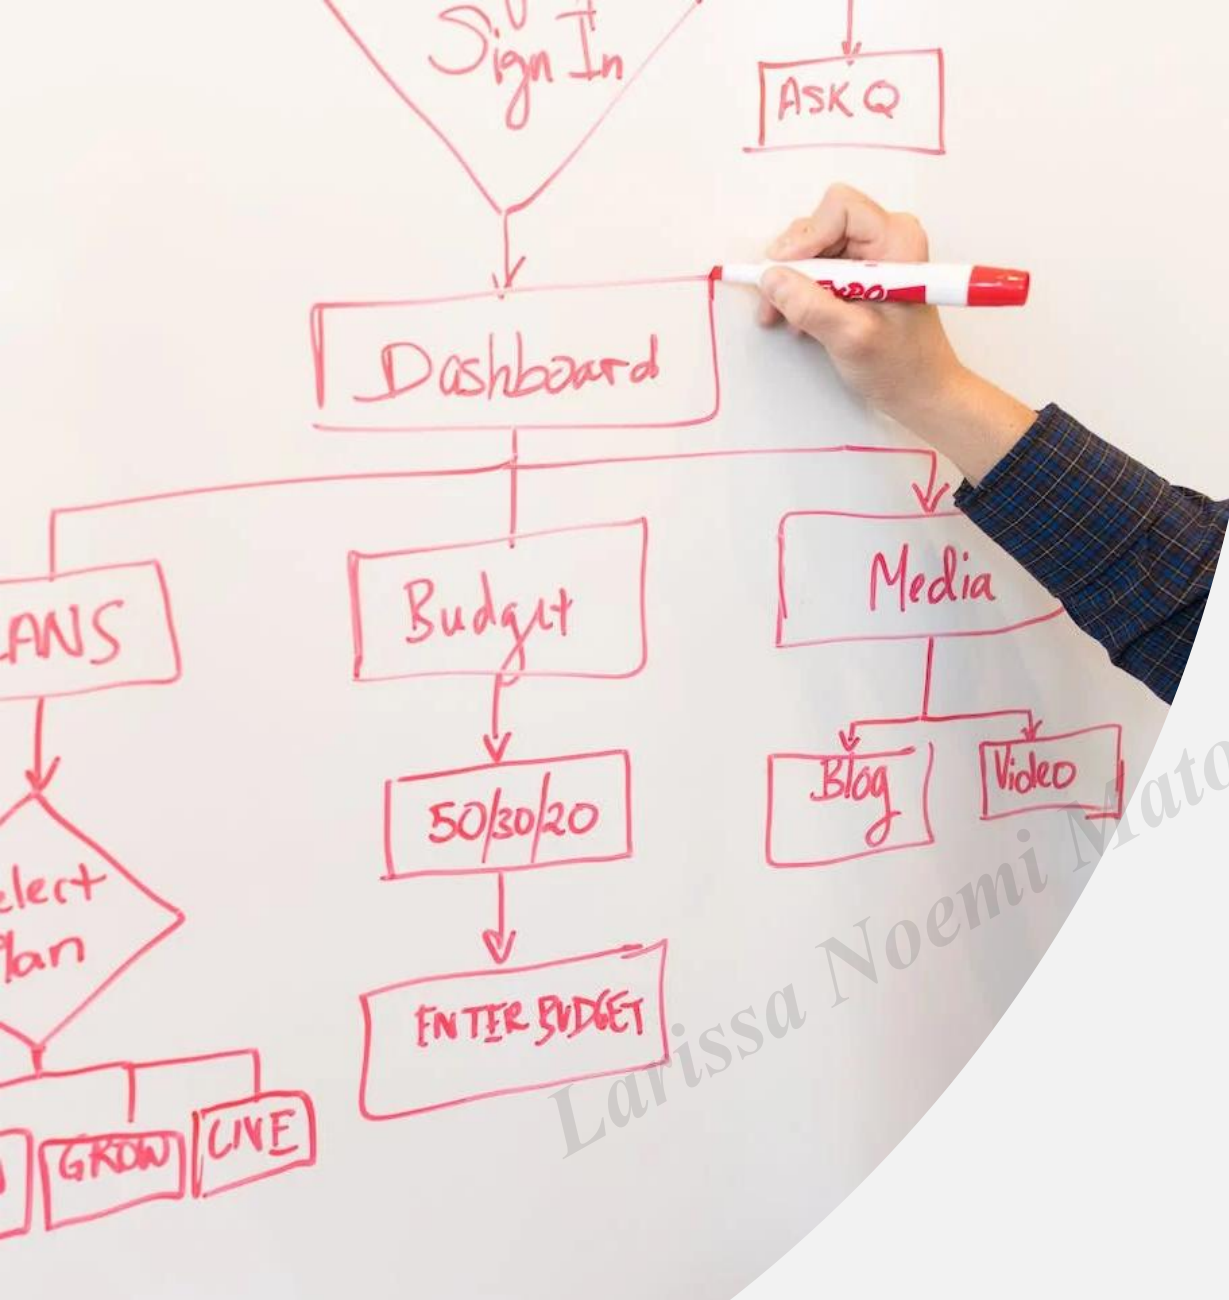

Implementar
os padrões e
os métodos
planejados

Estabelecer e gerenciar os canais de comunicação do projeto





Coletar e documentar lições aprendidas e
implementar as atividades de melhorias
nos processos aprovados

CASE: Fun Life Park

Construir um novo parque de diversões. Por quê?


- Existe um mercado promissor para o entretenimento no formato de parques
- Existem investidores potenciais para este tipo de empreendimento
- Após a pandemia existe uma procura ainda maior pelo entretenimento.




Colaboração



376.154.398-09

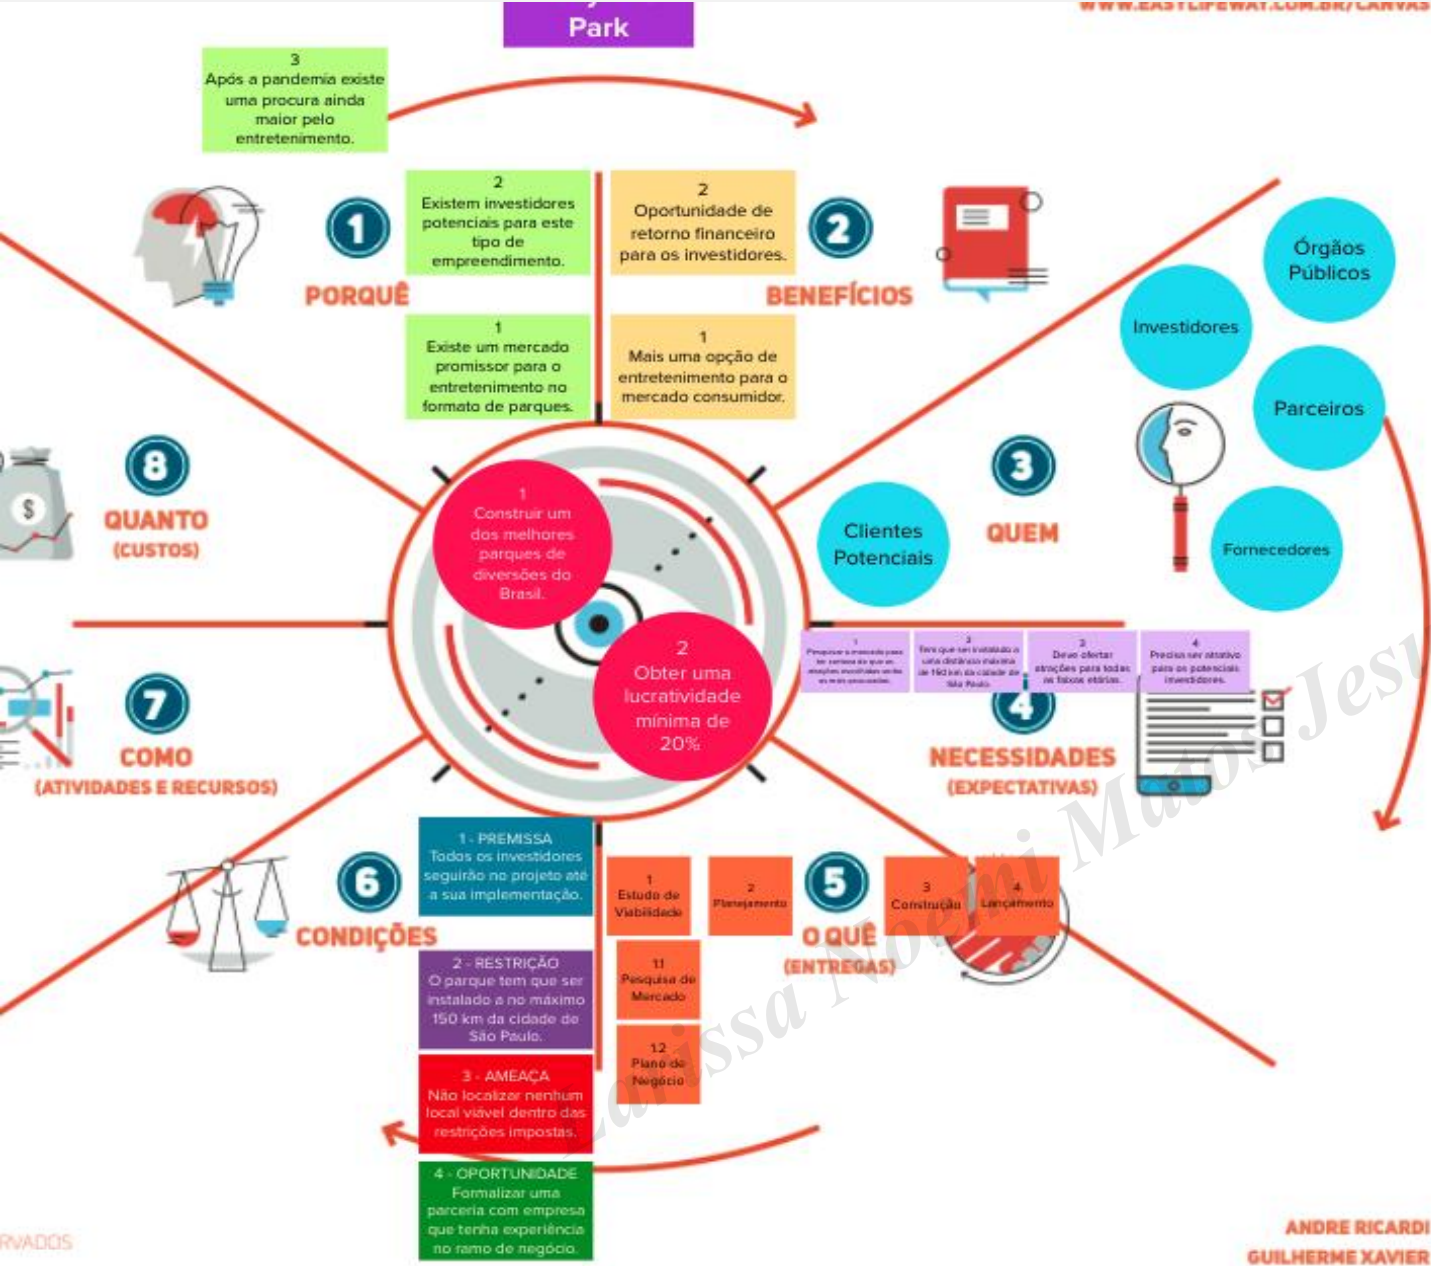

Metodologia Easy Life e Ferramentas de Colaboração

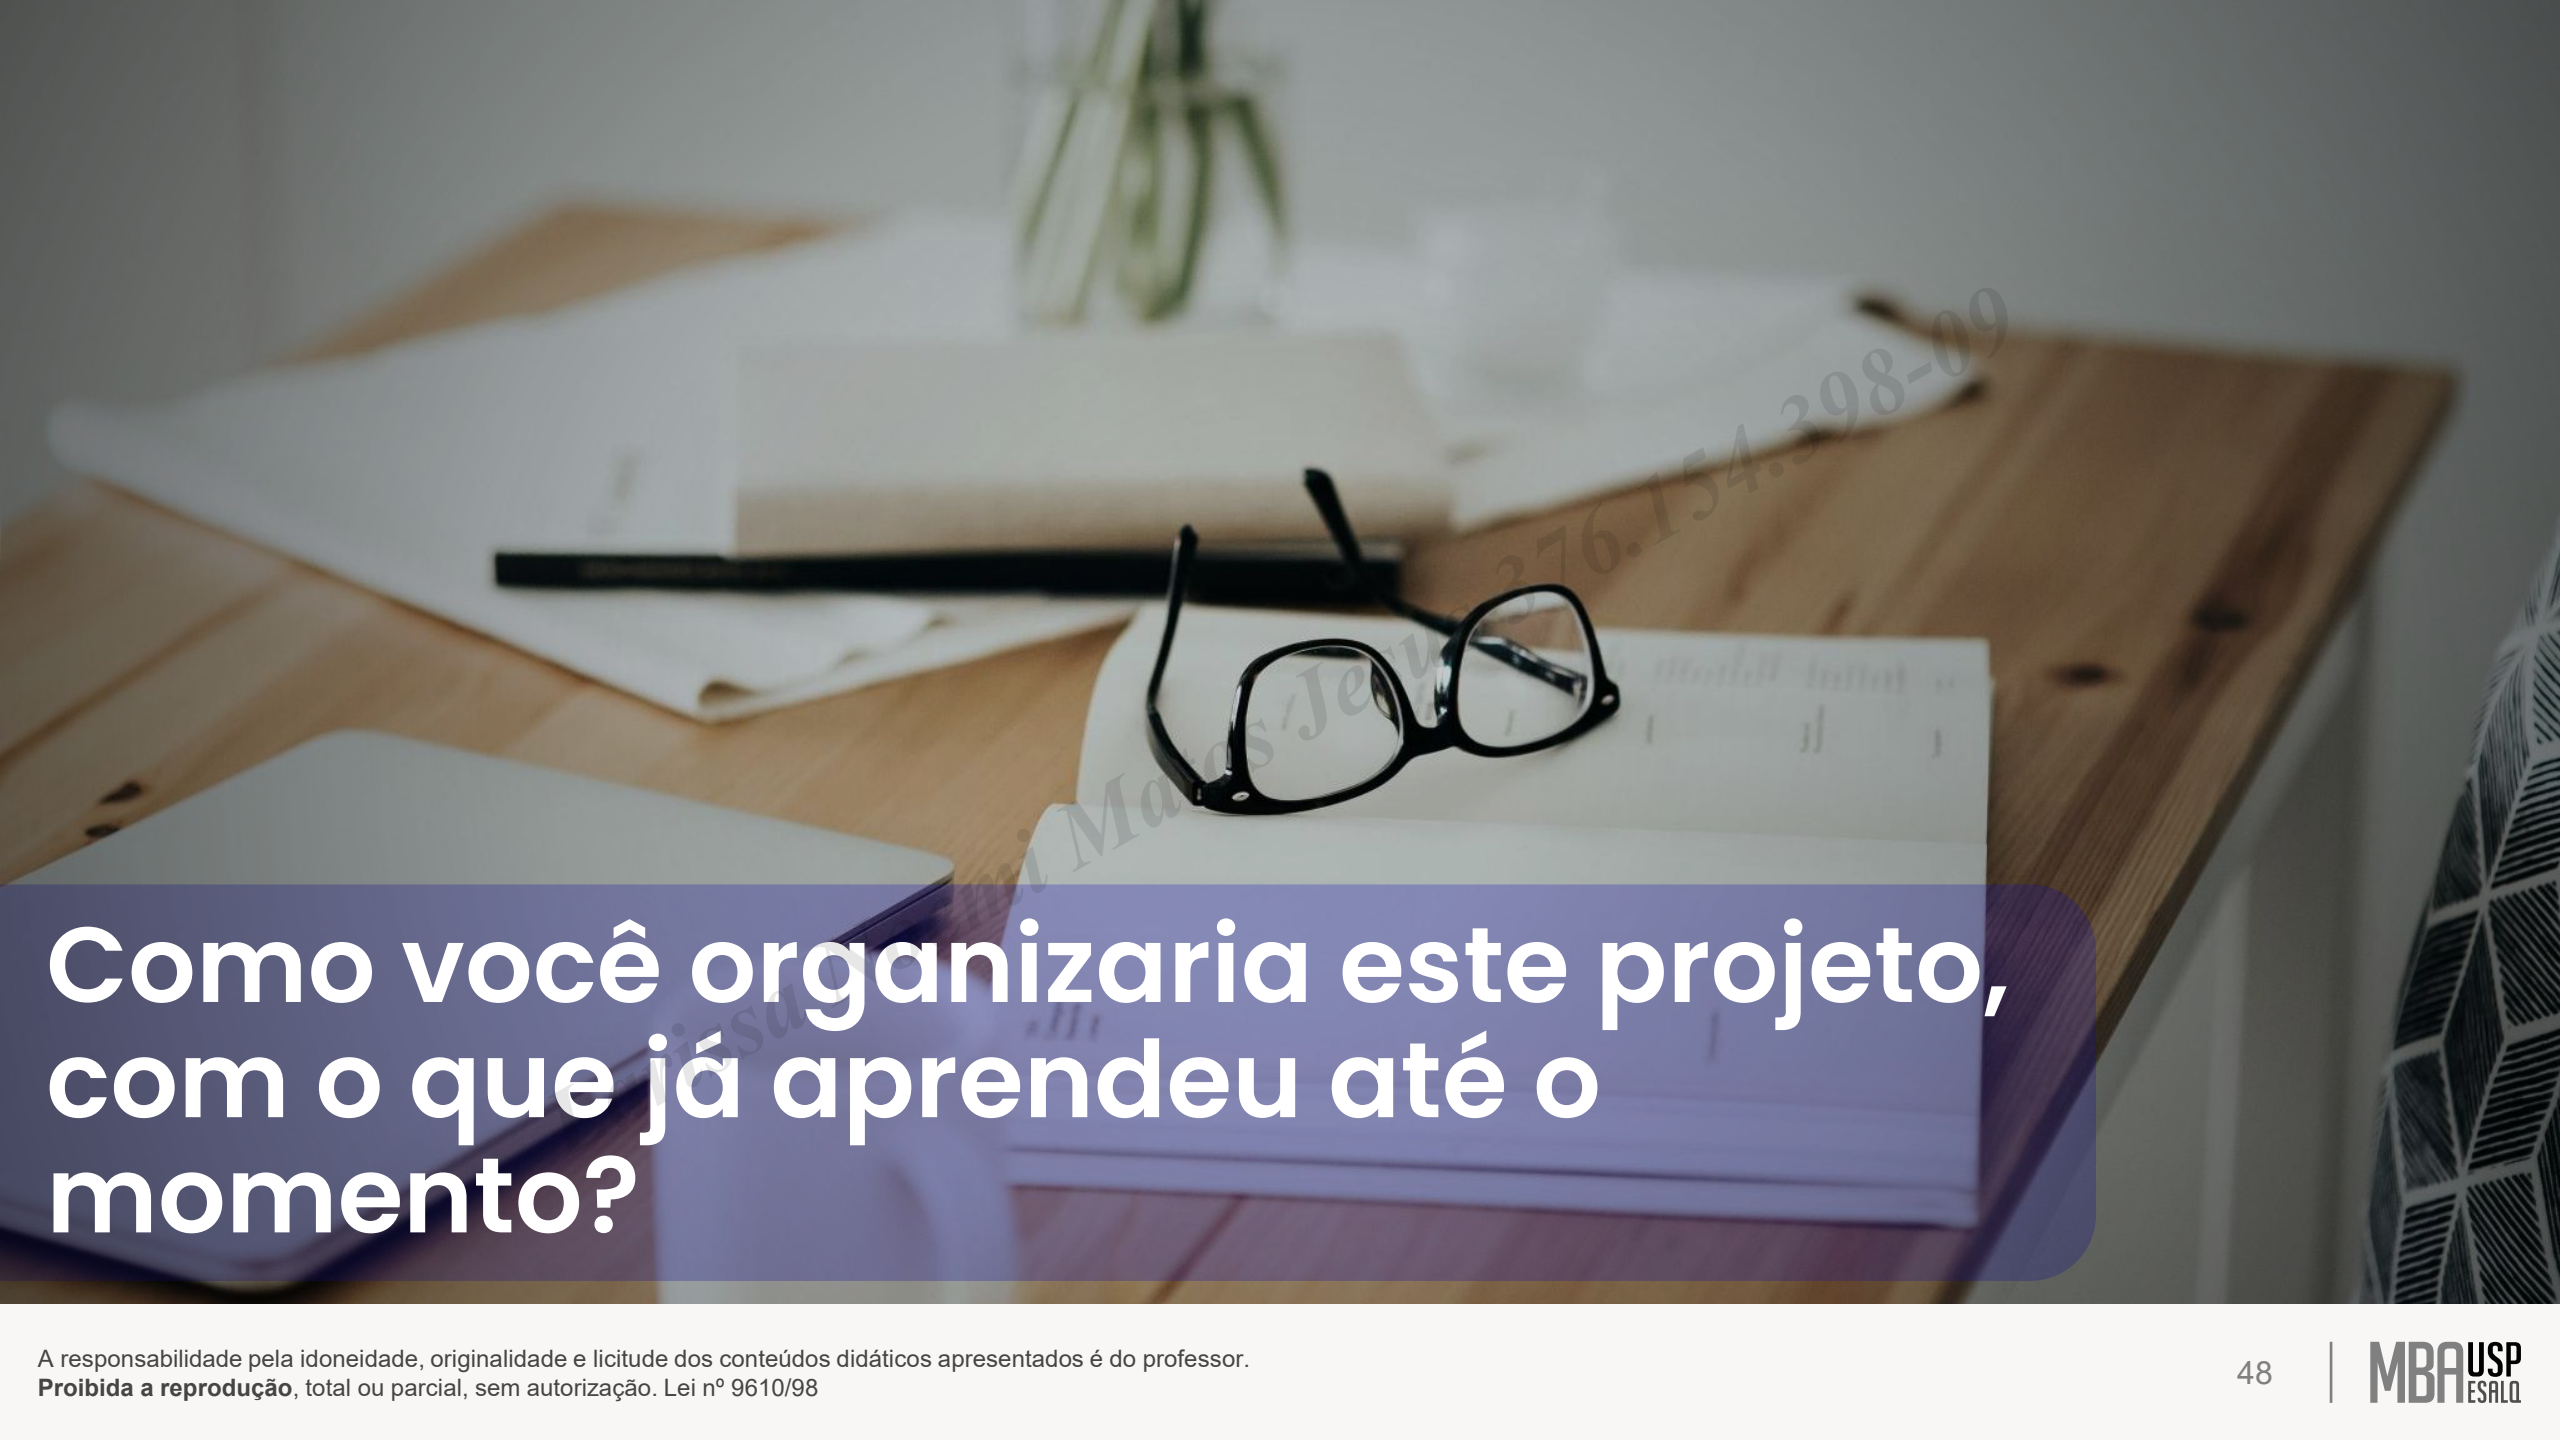

Como você organizaria este projeto,
com o que já aprendeu até o
momento?

Template Use templates to create new murals.

Ed



O que é o Easy Life Canvas.




Passo a passo para o preenchimento.



Download do Canvas



YouTube



Como superar os desafios no meio do caminho

2º Bloco

“

Monitorar o engajamento das partes interessadas é responsabilidade do gerente de projetos, e deve ocorrer continuamente durante todo o projeto.

”

Lembre-se de que o interesse das pessoas pelo projeto pode mudar com o tempo.





A sua equipe tem apresentado um desempenho ruim. Alguns dos membros da equipe o procuram informalmente para comentar que eles estão cansados de responder a questões relacionadas a temas que não são de sua responsabilidade, mas que deveriam ser direcionadas a especialistas de outras áreas. Como você deveria responder a eles para manter a motivação da equipe e recuperar o bom desempenho anterior?

- A. Vamos cuidar juntos para que essas perguntas que estão nos direcionando sejam respondidas, e seguir em frente. Conto com vocês para darmos continuidade no projeto com o desempenho esperado.
- B. Nós precisamos que vocês respondam a essas questões, senão não conseguiremos dar continuidade em nosso trabalho.
- C. Vocês precisam responder a essas questões ou direcionar a alguém que consiga respondê-las. Isso precisa ser feito!
- D. Pode deixar que eu respondo para vocês, ou procuro alguém que consiga respondê-las e cuido disso pessoalmente.


Autor: André Ricardi - Direitos Reservados

Resposta correta: A.

Liderança está relacionada a fazer as coisas através do bom exemplo e cuidar do bem-estar da equipe antes de qualquer coisa. Gestão está relacionada a fazer as coisas para que o progresso seja mantido e as metas sejam atingidas, cumprindo o que foi prometido. Essas ações podem ser feitas de forma colaborativa.

- A. Vamos cuidar juntos para que essas perguntas que estão nos direcionando sejam respondidas, e seguir em frente. Conto com vocês para darmos continuidade no projeto com o desempenho esperado.
- B. Nós precisamos que vocês respondam a essas questões, senão não conseguiremos dar continuidade em nosso trabalho.
- C. Vocês precisam responder a essas questões ou direcionar a alguém que consiga respondê-las. Isso precisa ser feito!
- D. Pode deixar que eu respondo para vocês, ou procuro alguém que consiga respondê-las e cuido disso pessoalmente.

Autor: André Ricardi - Direitos Reservados

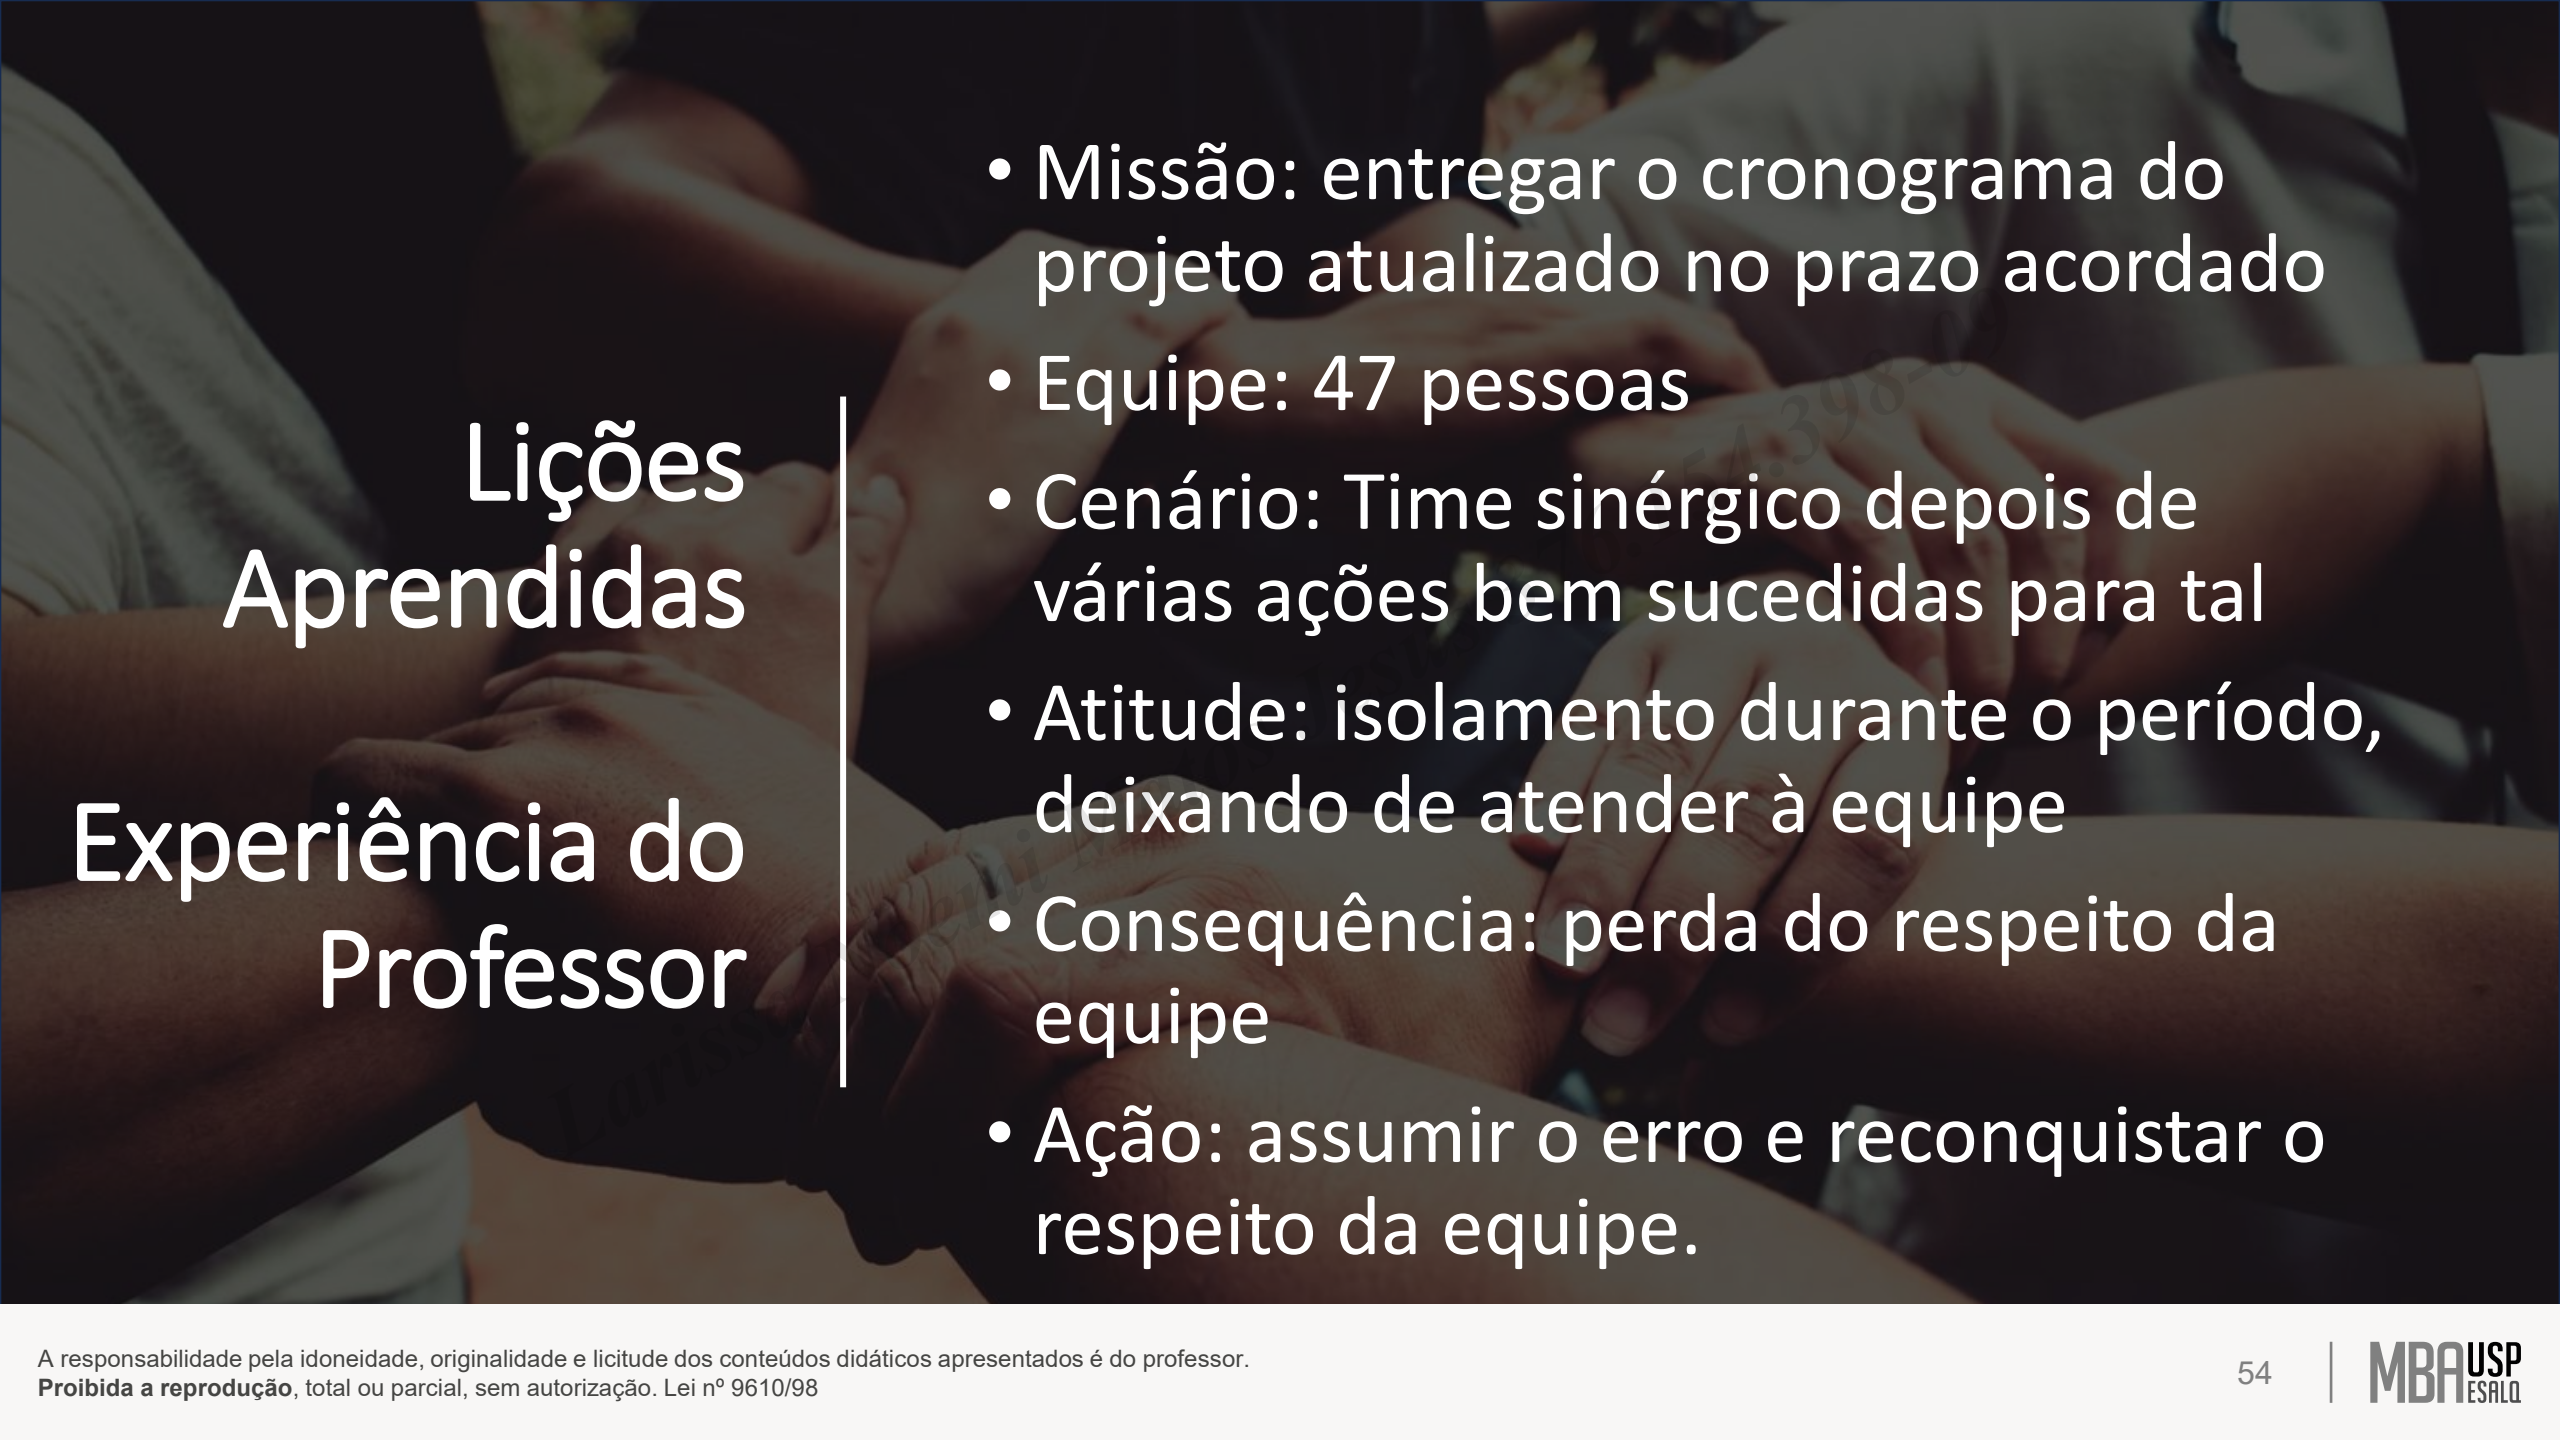

Lições Aprendidas

Experiência do Professor

- Missão: entregar o cronograma do projeto atualizado no prazo acordado
- Equipe: 47 pessoas
- Cenário: Time sinérgico depois de várias ações bem sucedidas para tal
- Atitude: isolamento durante o período, deixando de atender à equipe
- Consequência: perda do respeito da equipe
- Ação: assumir o erro e reconquistar o respeito da equipe.



O seu superior imediato tem reclamado que sua equipe não consegue trabalhar com foco, pois quando entra na sala os membros estão conversando sobre temas que não estão relacionados ao projeto, e essa pessoa entende que isso é importante para terem um bom desempenho, ou seja, trabalhar com mais foco. Como líder do projeto, como você pode influenciar a todos para reduzir essa situação aparentemente negativa, e que pode impactar no bom desempenho de todos?

- A. Reunindo a equipe e comentando que está ok eles conversarem sobre outros temas durante o trabalho, mas eles devem reduzir isso quando o superior entrar na sala.
- B. Reunindo a equipe e explicando que a pessoa está no comando e que é importante atender às suas expectativas.
- C. Conversando primeiramente com seu superior imediato e explicando que é natural que as pessoas conversem sobre outros temas durante o trabalho, e depois conversando com a equipe que está ok eles conversarem sobre temas de seu interesse durante o trabalho, porém que o façam nos intervalos a fim de não prejudicar o desempenho da equipe.
- D. Deixando que as coisas se resolvam naturalmente e que o superior fale diretamente com a equipe.

Autor: André Ricardi - Direitos Reservados

Resposta correta: C.

Ser direto e explicar as razões a todos costuma ser uma boa solução. O superior provavelmente não percebe que manter o entusiasmo e a motivação do time passa por dar liberdade a que comentem sobre outros temas, e o time talvez não tenha percebido que acaba atrapalhando aos demais se esta atitude for muito frequente no ambiente de trabalho. Flexibilidade e solução. Gestão proativa.

durante o trabalho, mas eles devem reduzir isso quando o superior entrar na sala.

B. Reunindo a equipe e explicando que a pessoa está no comando e que é importante atender às suas expectativas.

C. Conversando primeiramente com seu superior imediato e explicando que é natural que as pessoas conversem sobre outros temas durante o trabalho, e depois conversando com a equipe que está ok eles conversarem sobre temas de seu interesse durante o trabalho, porém que o façam nos intervalos a fim de não prejudicar o desempenho da equipe.

D. Deixando que as coisas se resolvam naturalmente e que o superior fale diretamente com a equipe.

Autor: André Ricardi - Direitos Reservados

Lições Aprendidas

Experiência do Professor



Missão: Superintendente solicitou tomar cuidado com o que fala nas reuniões com a VP



Equipe: empresa externa



Cenário: cliente interno pressiona demais e ambiente frenético



Atitude: conversa com o superior explicando que a sinceridade e competência técnica conquistaram a VP



Consequência: concordância do superior, reforçando para mesmo assim tomar cuidado



Ação: uma vez de acordo, continuar sendo sincero, mas tendo cautela.

Todas opiniões são importantes e precisam ser consideradas.

Os Ativos de Processos Organizacionais e os Fatores Ambientais da Empresa ajudam a equilibrar qual a melhor decisão para cada cenário.

Profissionais de projetos devem cuidar para que cada situação seja considerada, e o contexto é muito importante.





Um profissional sênior tem apresentado uma queda de desempenho. O líder desse profissional procurou você mais de uma vez para advertir sobre esta situação, destacando que nenhuma de suas sugestões anteriores surtiram resultado. Já é a terceira vez nesse mês que esse líder o procura para tratar desse assunto. O que você deve fazer? (escolha a melhor resposta)

- A. Pedir ao líder que tente novamente as ações que recomendou anteriormente, e que te procure caso não tenha resultado em 15 dias.
- B. Chame o profissional sênior para uma conversa e fale diretamente com ele sobre o assunto, e depois fale separadamente com o líder.
- C. Peça ao líder que procure um profissional para substituir a pessoa solicitando ajuda do departamento de RH da empresa.
- D. Antes de sugerir alguma nova ação, entenda com o líder o que pode estar acontecendo com mais detalhes. Talvez o sênior esteja com problemas pessoais e vocês possam atuar de forma colaborativa. Certifique-se de entender bem a situação antes de agir.

Autor: André Ricardi - Direitos Reservados

Um profissional sênior tem apresentado uma queda de desempenho. O líder desse profissional procurou você mais de uma vez para advertir sobre esta situação, destacando que nenhuma de suas sugestões anteriores surtiram resultado. Já é a terceira vez nesse mês que esse líder o procura para tratar desse assunto. O que você deve fazer? (escolha a melhor resposta)

Resposta correta: D.

Como as sugestões anteriores não funcionaram, importante mudar a abordagem e apresentar uma nova solução. Atuar como um coach do líder com espírito colaborativo e procurando entender o cenário com mais detalhes é um caminho mais efetivo do que o punitivo. Empatia e a busca de uma solução colaborativa, orientando a sua equipe, certamente trarão melhores resultados.

D. Antes de sugerir alguma nova ação, entenda com o líder o que pode estar acontecendo com mais detalhes. Talvez o sênior esteja com problemas pessoais e vocês possam atuar de forma colaborativa. Certifique-se de entender bem a situação antes de agir.

Autor: André Ricardi - Direitos Reservados

O líder eficaz ensina a pescar,
e não fornece o peixe.

Atuar como coach do seu time e
entender os cenários antes das tomadas
de decisão certamente ajudarão a formar
uma equipe de alto desempenho.



Lições Aprendidas

Experiência do Professor

Missão: resolver um conflito entre duas profissionais que respondiam para líderes diferentes

Equipe: interna com 45 pessoas


Cenário: líderes tinham alçada para resolver e me procuraram para apoiar na resolução do conflito

Atitude: reunião com os 4 envolvidos, líderes e as duas envolvidas

Consequência: as duas ficaram super amigas

Ação: monitoramento pós reunião para verificar se de fato estava resolvido

OBJETIVOS

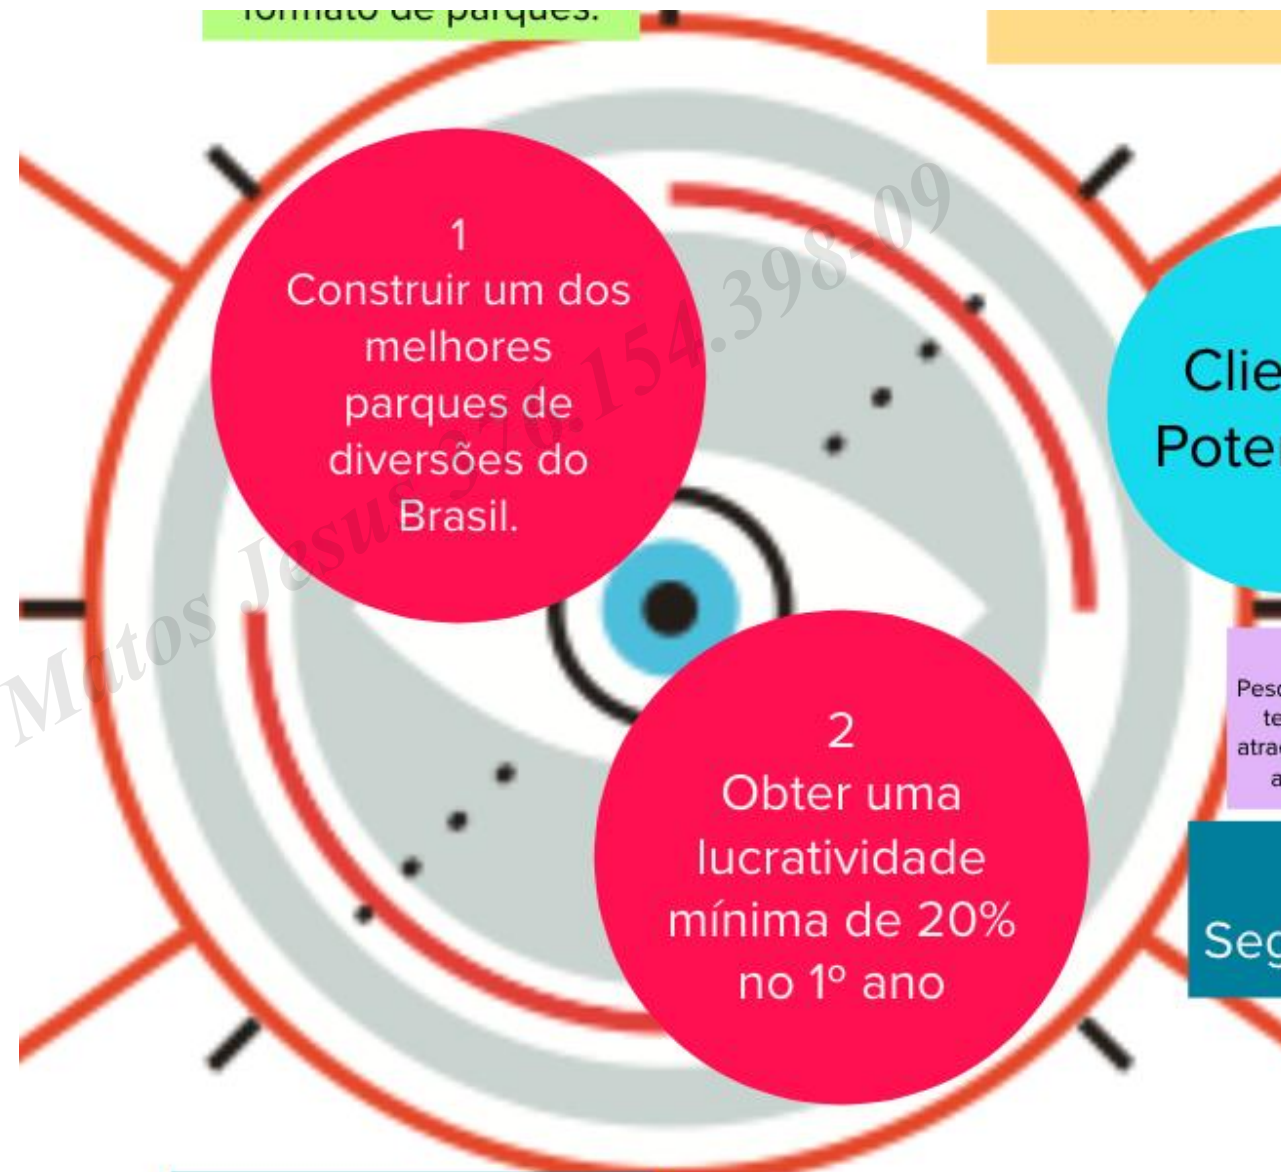

EASY LIFE CANVAS

PORQUÊ

12
Rio
Facilidade de incentivos
federais para área de
entretenimento

11
Deocleciano
Elevar a qualidade de
vida.

9
Sato
Fácil acesso regional.

6
Viscaino
Atividades ao ar livre tem
tido procura maior no
período pós pandêmico.

10
Leandro
Desenvolvimento
turístico, imobiliário e
econômico da região.

8
André
Muitos parques
fecharam durante a
pandemia, existe
uma carência no
momento

3
Após a pandemia
existe uma procura
ainda maior pelo
entretenimento.

5
MH
crescimento
populacional muitas
crianças




PORQUÊ

7
Ricardo
Existe impacto
ambiental no projeto.


2
Existem investidores
potenciais para este
tipo de
empreendimento.

4
MH
obter lucro

1
Existe um mercado
promissor para o
entretenimento no
formato de parques.

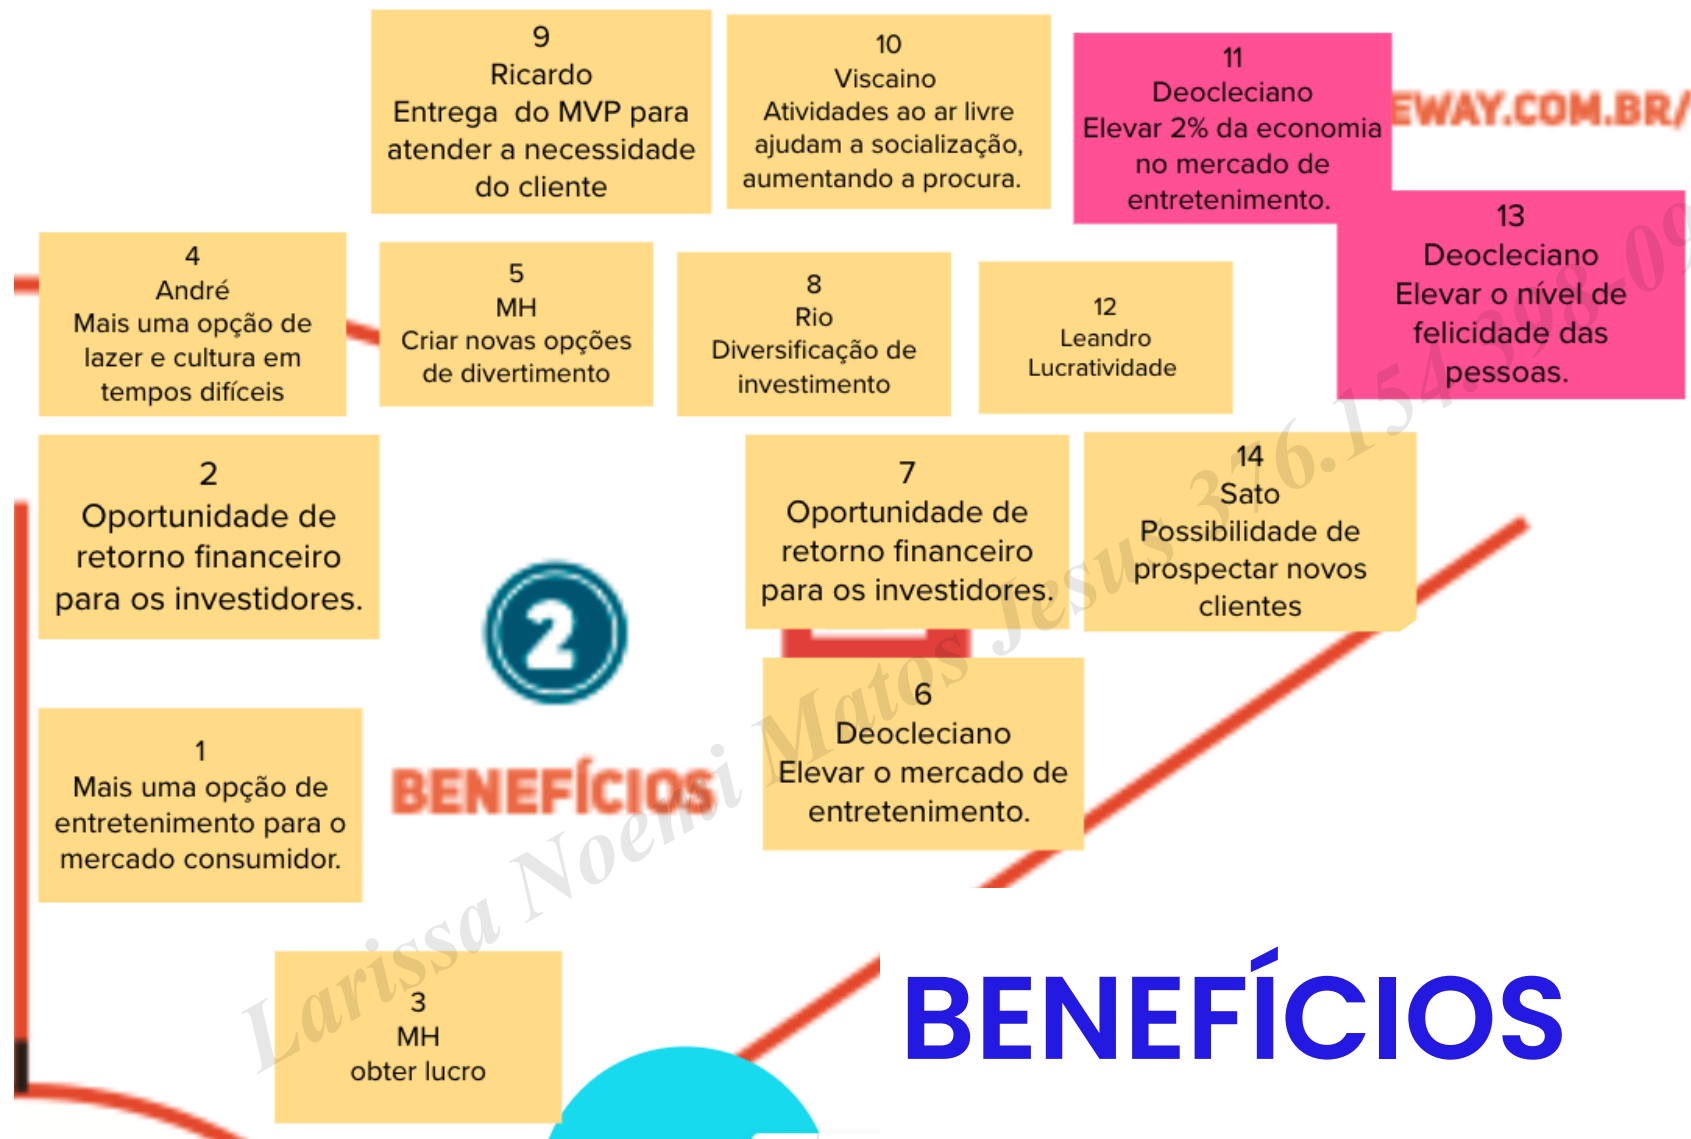

QUEM (Partes Interessadas)

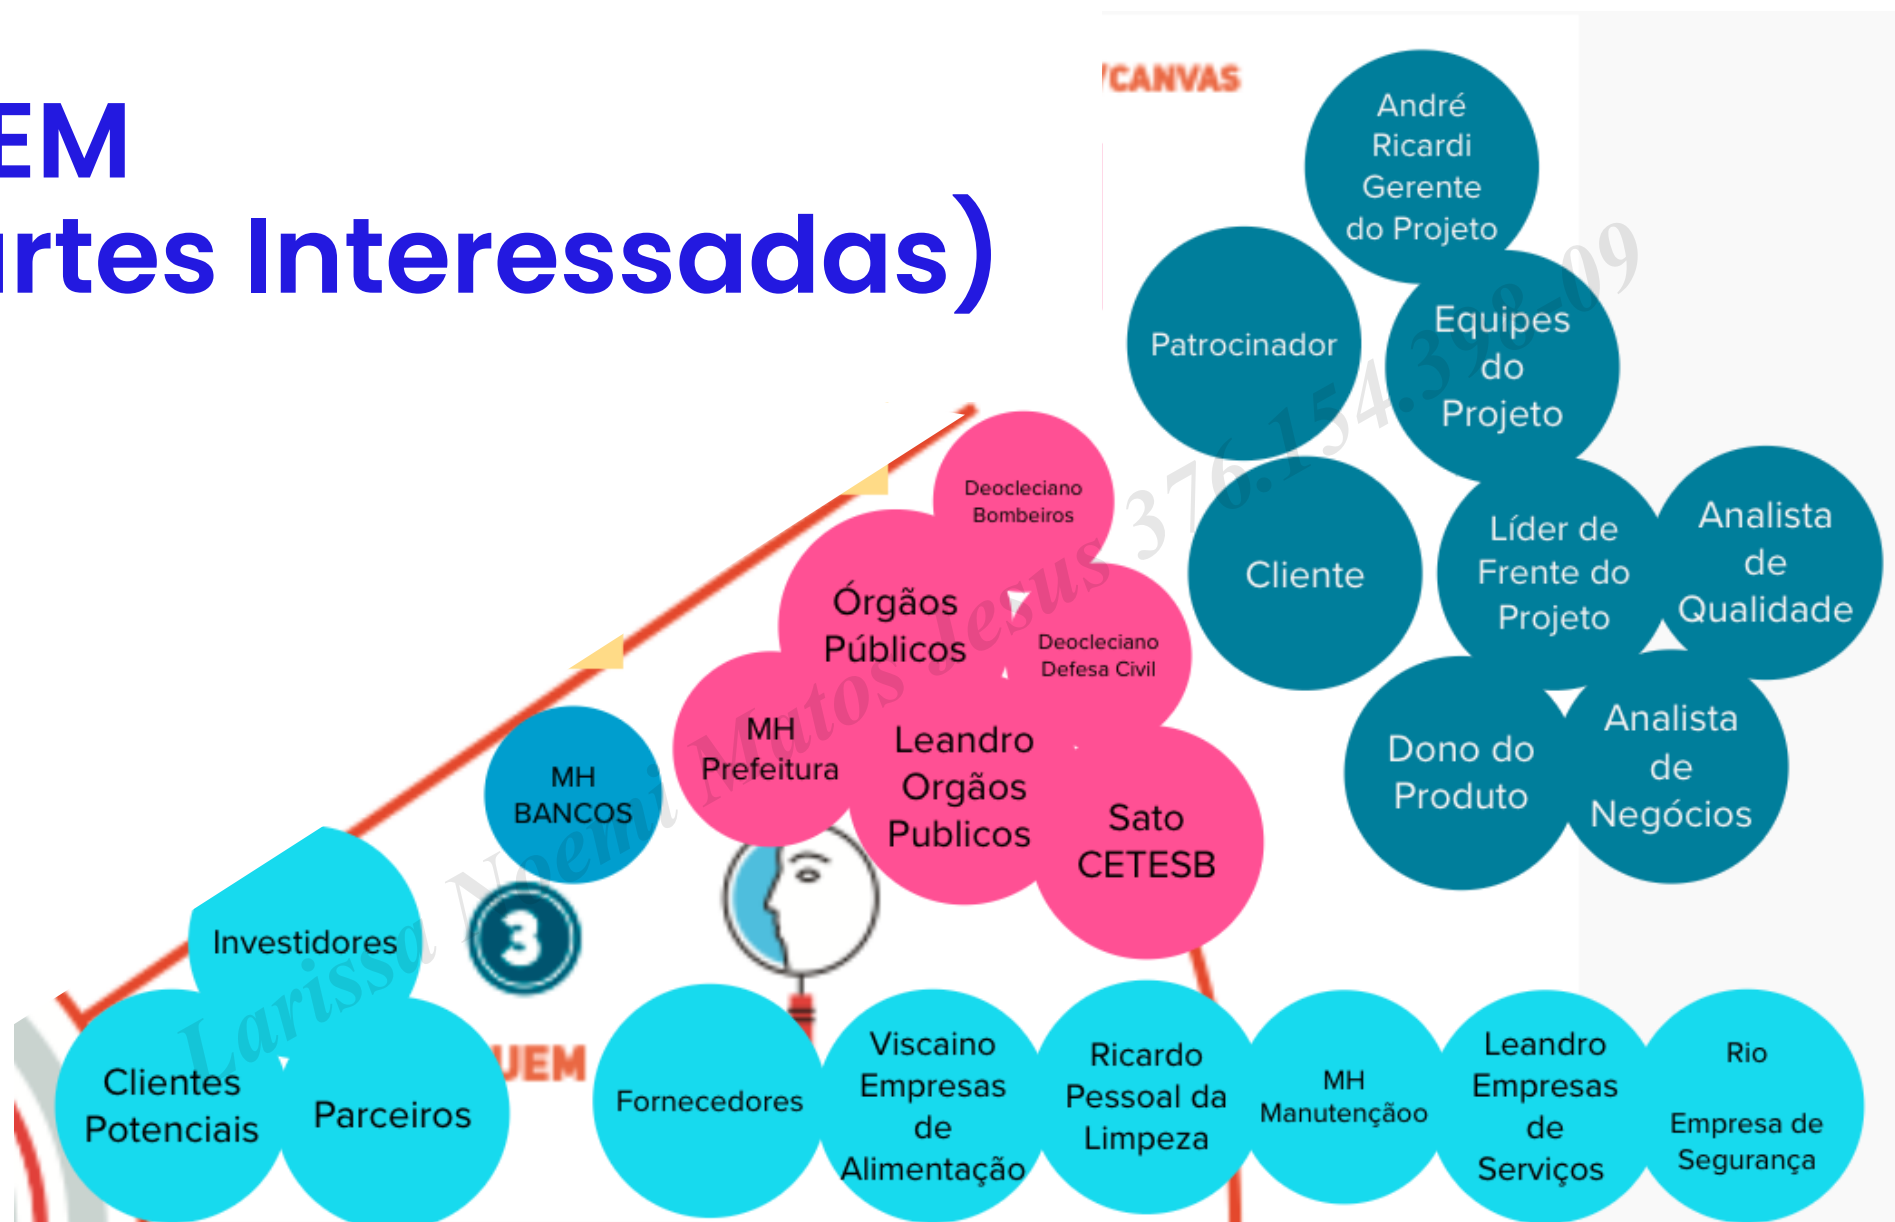




O QUÊ (Entregas)



CONDIÇÕES (Premissas, Riscos e Restrições)




COMO

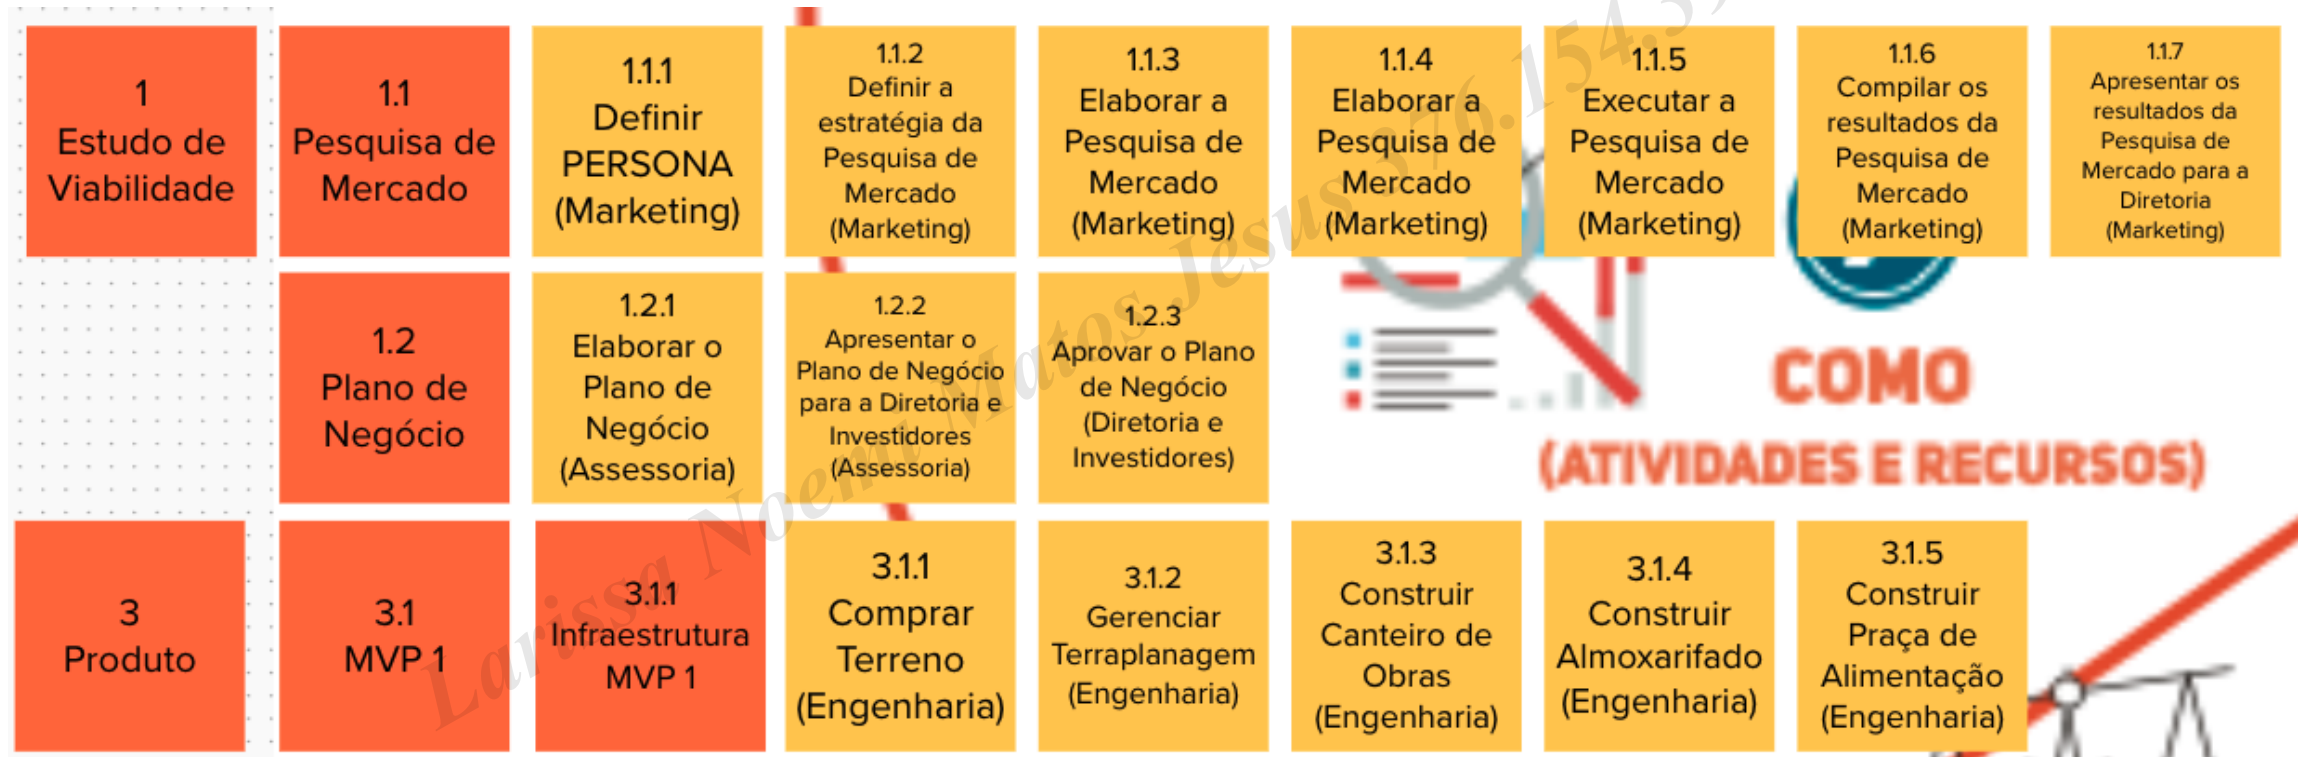

COMO
(ATIVIDADES E RECURSOS)





CASE: Fun Life Park

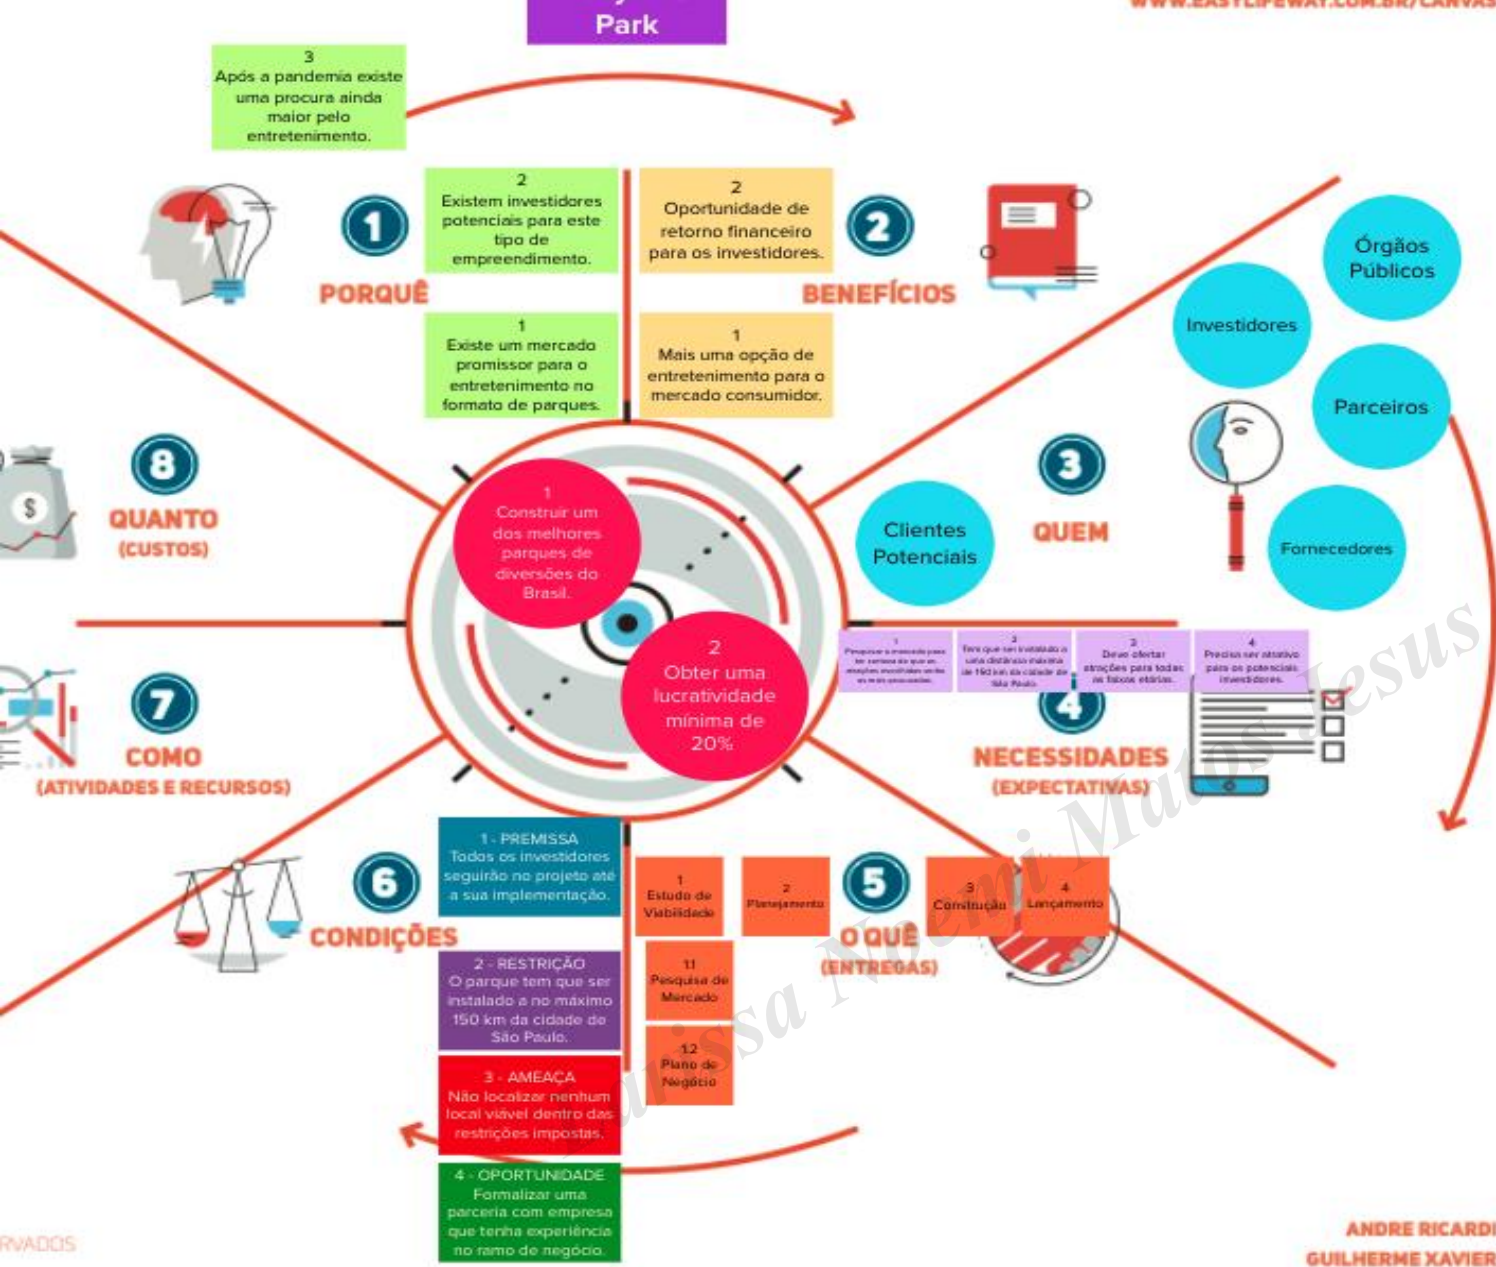


Será necessário antecipar 3 meses na entrega do MVP 1 | Fase 1

Previsão inicial é entregar em novembro/2026.

Motivo: descobriram que um concorrente vai lançar um parque em outubro em uma região próxima.

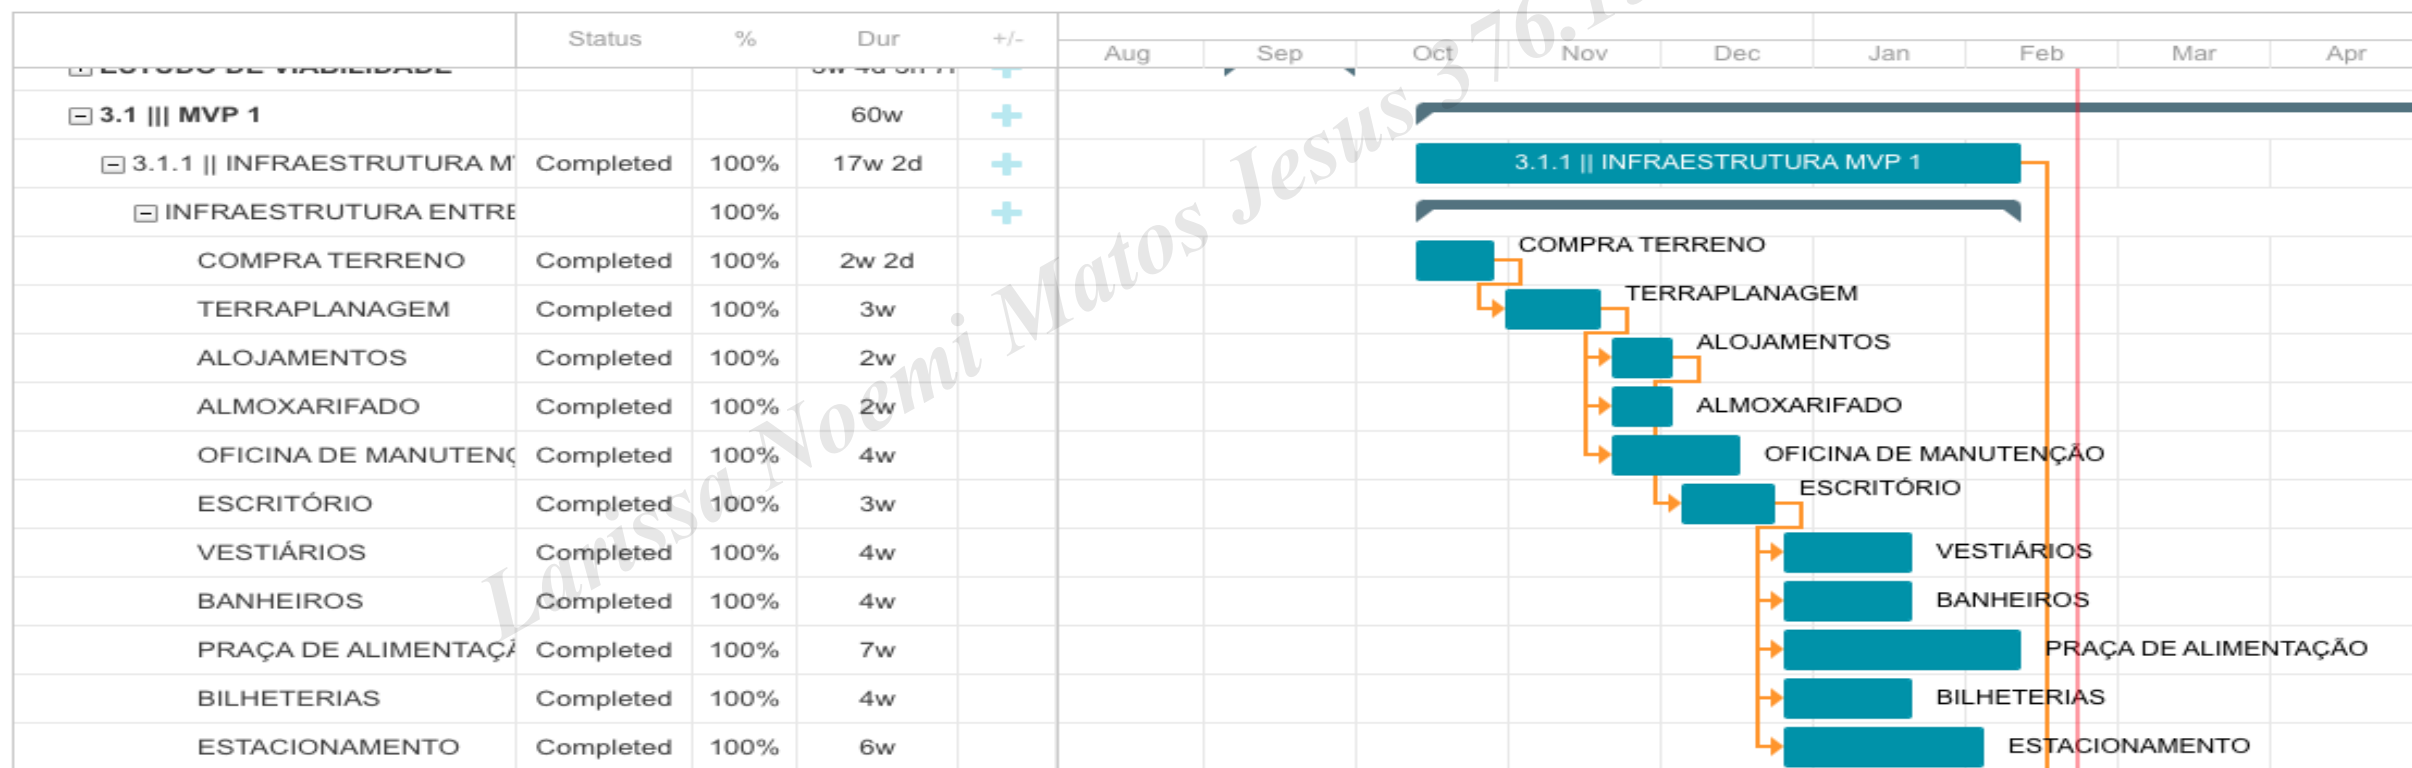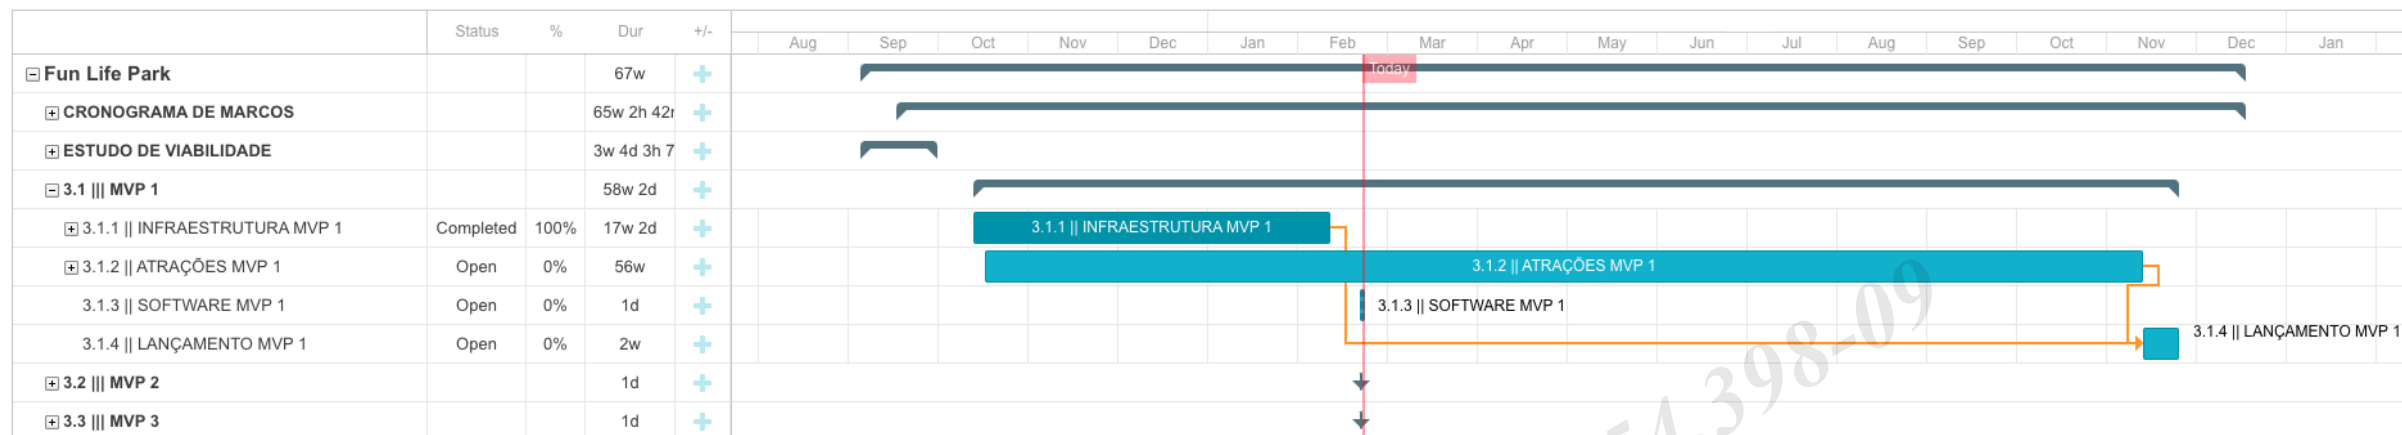

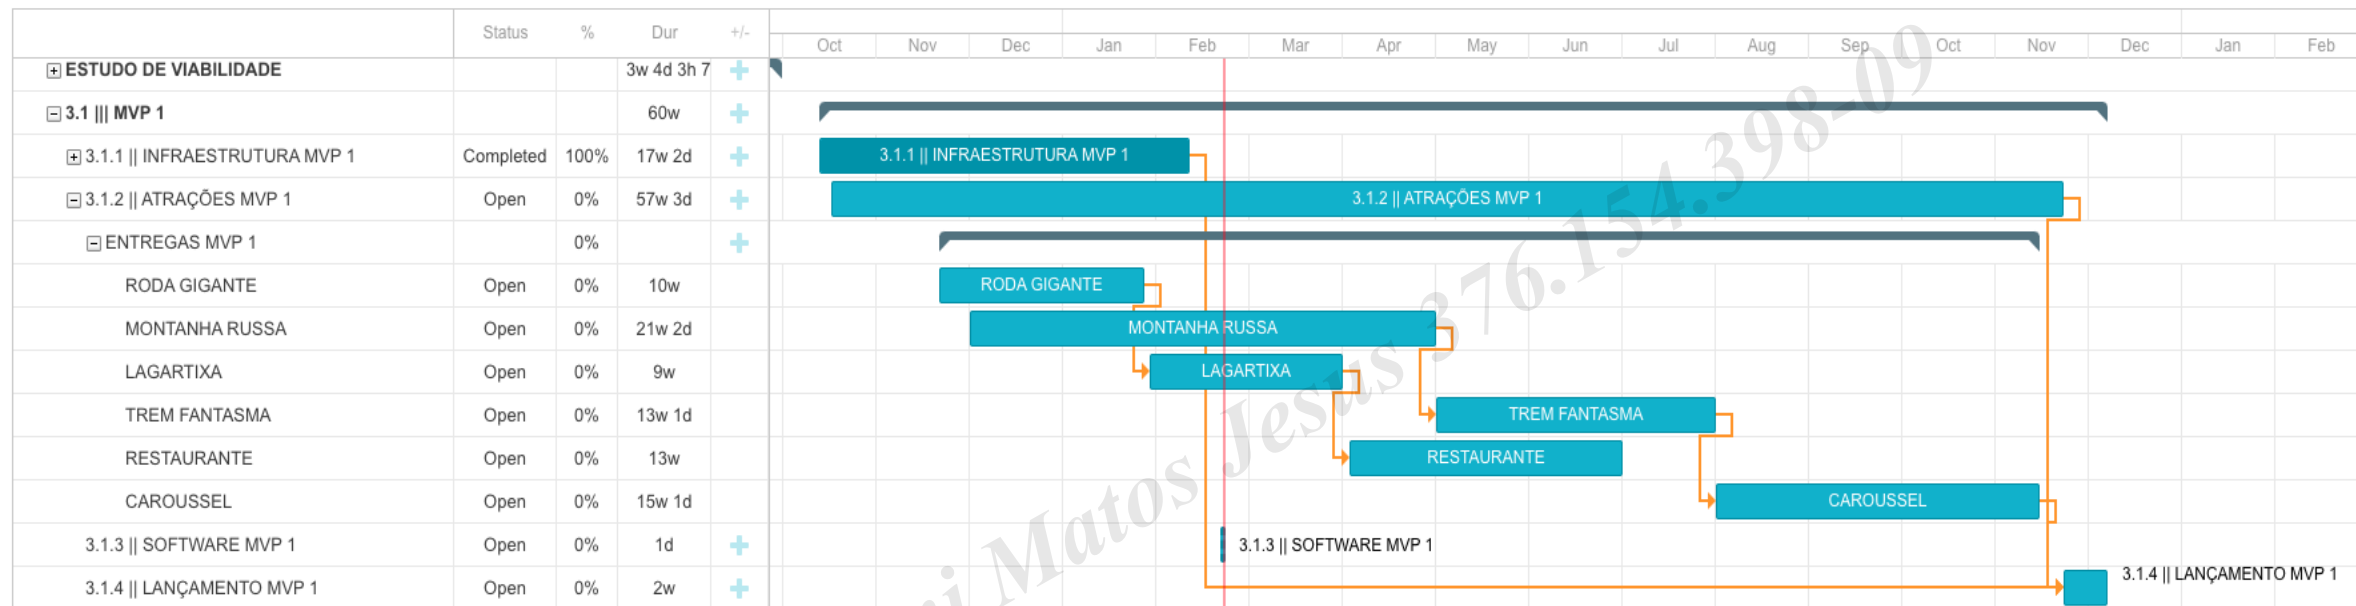

O que o grupo deve fazer?

15 minutos

1 - Estruturar a estratégia do MVP/FASE 1 para entregar no novo prazo: ago/2026

2 - Avaliar riscos da mudança

3 - Explicar porque tomaram esta decisão, apesar dos riscos




Apresentação de 2 grupos em no máximo 5 minutos.

No retorno do Intervalo

Como Gerenciar Conhecimento e Mudanças

3º Bloco

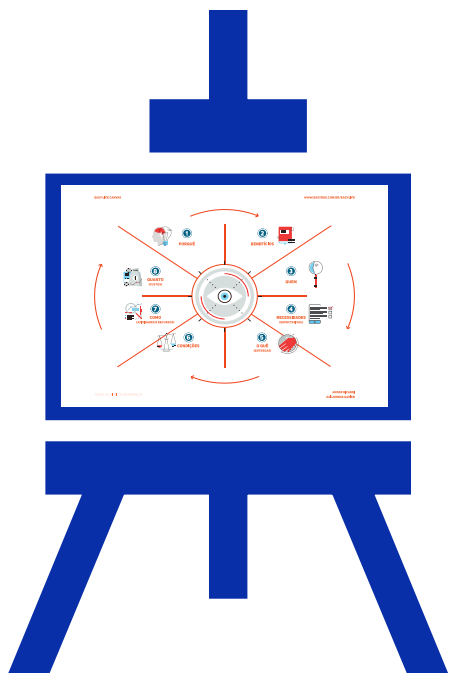

Como ficaram os Cronogramas dos Grupos?



Apresentação de 2 grupos em no máximo 5 minutos.

Trello Áreas de trabalho Recentemente Marcado com estrela Modelos Criar

Fun Life Park Visível à Área de trabalho Quadro Board Gantt Track Planner Mirror Rules Power-up do Calendário Power-Ups Automação Filtro Compartilhar

Informações Importantes

Assista o vídeo da AULA GRATUITA ONLINE - ADVYD

01/set/22 19h30 às 22h30

Assista o vídeo da AULA GRATUITA do último dia 01-set e avalie se o tema é de seu interesse.

1

Clique aqui para saber como utilizar este modelo em seus projetos

Sobre o autor: André Ricardi

Sobre o Project Management Institute (PMI®)

O que é: o Guia PMBOK® 7ª edição

12 Princípios:

- Administração (Stewardship)
- Equipe
- Partes Interessadas
- Valor
- Pensamento holístico
- Liderança
- Adaptação (Tailoring)
- Qualidade

O que são: Princípios do Gerenciamento de Projetos

Guia PMBOK® 7ª edição

+ Adicionar um cartão

1 - Canvas

Easy Life Canvas

+ Adicionar um cartão

2 - Painel de Controle

Painel de Controle do Projeto

GOVERNANÇA DO PROJETO

VISÃO COMUM

ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO E ENTREGA

CICLO DE VIDA DO PROJETO

EQUIPE

PROCESSOS

MEDIÇÃO

MÉTODOS

ARTEFATOS

Modelo cartão para Atas de Reuniões

+ Adicionar um cartão

Questões

Modelo cartão para Questões

+ Adicionar um cartão

Entregas/Atividades | ou | Backlog de Projeto

Dicas para quem organiza (GP/SM/Líder)

Dicas para quem participa

Modelo cartão Entregas / Tarefas | (nome) (score)

+ Adicionar um cartão

CRONOGRAMA DE MARCOS

PESQUISA DE MERCADO

16 de set de 2022

PLANO DE NEGÓCIO

30 de set de 2022

INICIAÇÃO CONCLUÍDA

4 de out de 2022

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

20 de out de 2022

INFRAESTRUTURA MVP 1

26 de dez de 2022 - 26 de dez de 2022

ATRAÇÕES MVP 1

18 de jan - 18 de jan

LANÇAMENTO MVP1

1 de fev

+ Adicionar um cartão

GESTÃO DO PROJETO

2.1 || INICIAÇÃO

3 de out de 2022 - 4 de out de 2022

2.2 || PLANEJAMENTO

5 de out de 2022 - 20 de out de 2022

2.3 || MONITORAMENTO & CONTROLE

5 de out de 2022 - 29 de dez de 2022

2.4 || ENCERRAMENTO

26 de dez de 2023 - 29 de dez de 2023

+ Adicionar um cartão

Gerenciar a equipe do projeto envolve habilidades com ênfase especial em:

- Comunicação
- Gerenciamento de conflitos
- Negociação
- Liderança.

(Guia PMBOK®, 2017)





Os gerentes de projetos devem fornecer tarefas desafiadoras para os membros da equipe e reconhecimento pelo alto desempenho.



(Guia PMBOK®, 2017)



Segundo o Guia PMBOK®, para gerenciar adequadamente as mudanças do projeto, todas as alternativas a seguir são adequadas ou possíveis, exceto qual?



- A. As atividades de gerenciamento de projetos não precisam estar alinhadas com a orientação de negócios de alto nível, e caso haja uma mudança, os objetivos do projeto devem ser realinhados
- B. Os gerentes de projetos esperam mudanças e implementam processos para mantê-las gerenciadas e controladas
- C. Fornecer feedback aos programas e portfólios solicitações de mudanças que podem identificar impactos em outros projetos, programas ou portfólios
- D. Mudanças nos objetivos do projeto podem afetar a sua eficiência e sucesso

Autor: André Ricardi - Direitos Reservados

Segundo o Guia PMBOK®, para gerenciar adequadamente as mudanças do projeto, todas as alternativas a seguir são adequadas ou possíveis, exceto qual?

A. As atividades de gerenciamento de projetos não precisam estar alinhadas com a orientação de negócios de alto nível, e caso haja uma mudança, os objetivos do projeto devem ser realinhados

Resposta correta: A.

Note que a alternativa está na negativa, afirmando que as atividades NÃO precisam estar alinhadas com a orientação de negócios de alto nível. O exame PMP vai medir se você presta atenção em detalhes.

sucesso

Autor: André Ricardi - Direitos Reservados

Michelle está gerenciando um projeto com questões a serem resolvidas quanto a partes interessadas não estarem assumindo suas responsabilidades, ruídos de comunicação por conta da equipe estar alocada em locais diferentes e recursos de tecnologia insuficientes para as necessidades do projeto. Como ela poderia resolver esta situação? Considere o que é mais importante para garantir o andamento do projeto no futuro imediato.



- A. Orientando as partes interessadas sobre sua importância para o projeto e alocando a equipe no mesmo local. A questão da tecnologia pode ser resolvida posteriormente.
- B. Resolvendo com prioridade a questão da tecnologia, pois ela é impeditiva para o desenvolvimento do projeto. Os demais itens devem ser resolvidos em paralelo, mas com prioridade menor.
- C. A comunicação deve ser a maior prioridade, pois se a equipe não estiver alinhada problemas sérios poderão ocorrer.
- D. Firmando compromissos de todas as partes interessadas quanto ao projeto, orientando a equipe e decidindo conjuntamente como solucionar os ruídos de comunicação.

Autor: André Ricardi - Direitos Reservados

Michelle está gerenciando um projeto com questões a serem resolvidas quanto a

Resposta correta: B.

É importante priorizar o que for impeditivo quando estiver atuando na resolução de questões. Se as partes interessadas mudarem seu comportamento, a equipe resolver os ruídos de comunicação mas não houver recursos de tecnologia suficientes, o desempenho do projeto será prejudicado de imediato. Então é importante focar nesse impedimento sem esquecer os demais, atuando neles em paralelo.

- B. Resolvendo com prioridade a questão da tecnologia, pois ela é impeditiva para o desenvolvimento do projeto. Os demais itens devem ser resolvidos em paralelo, mas com prioridade menor.
- C. A comunicação deve ser a maior prioridade, pois se a equipe não estiver alinhada problemas sérios poderão ocorrer.
- D. Firmando compromissos de todas as partes interessadas quanto ao projeto, orientando a equipe e decidindo conjuntamente como solucionar os ruídos de comunicação.

Autor: André Ricardi - Direitos Reservados


Ciclo de Vida Preditivo




- Alta certeza quanto a requisitos
- Equipe estável
- Baixo risco

(Baseado na Figura 3-2 do Guia Ágil, 2017, p. 21)

Visão Geral de Projeto Preditivo (Simplificado)

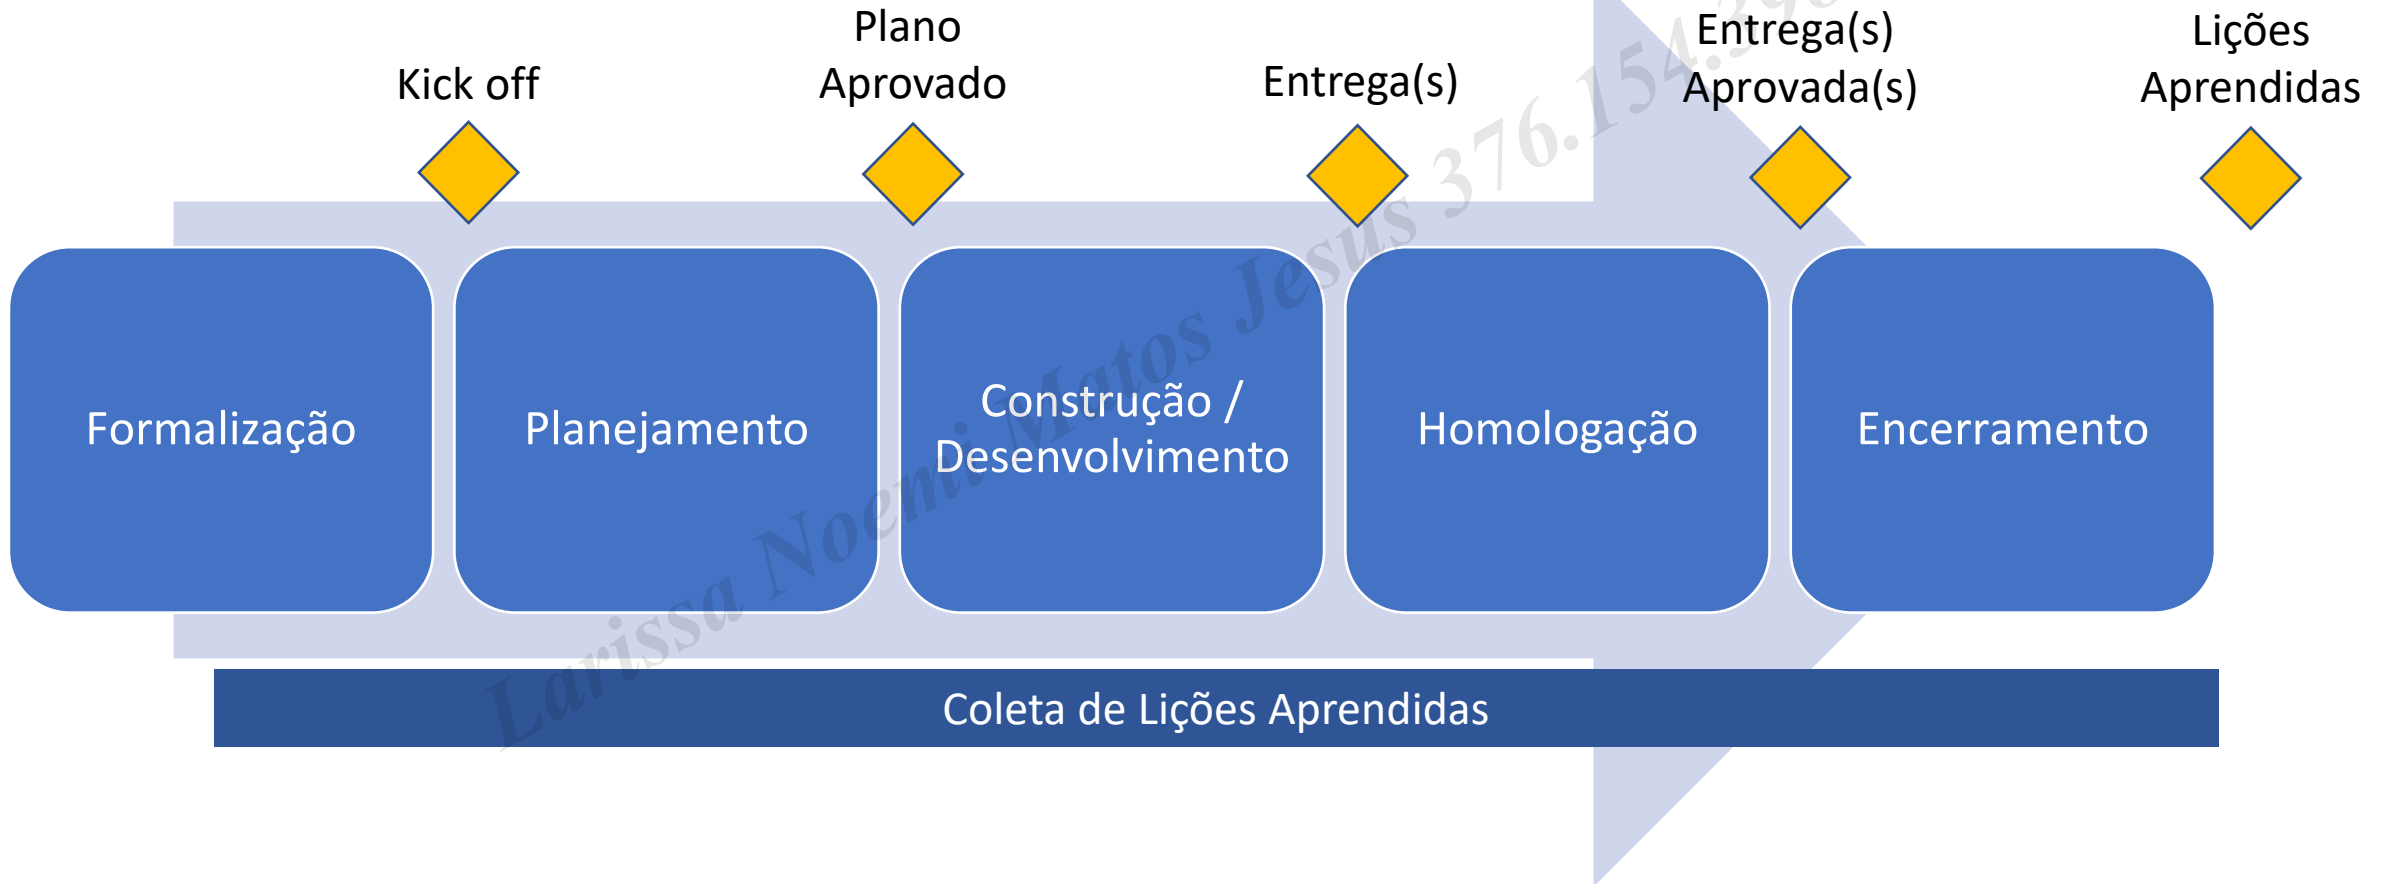


Visão Geral de Projeto Faseado (Simplificado)

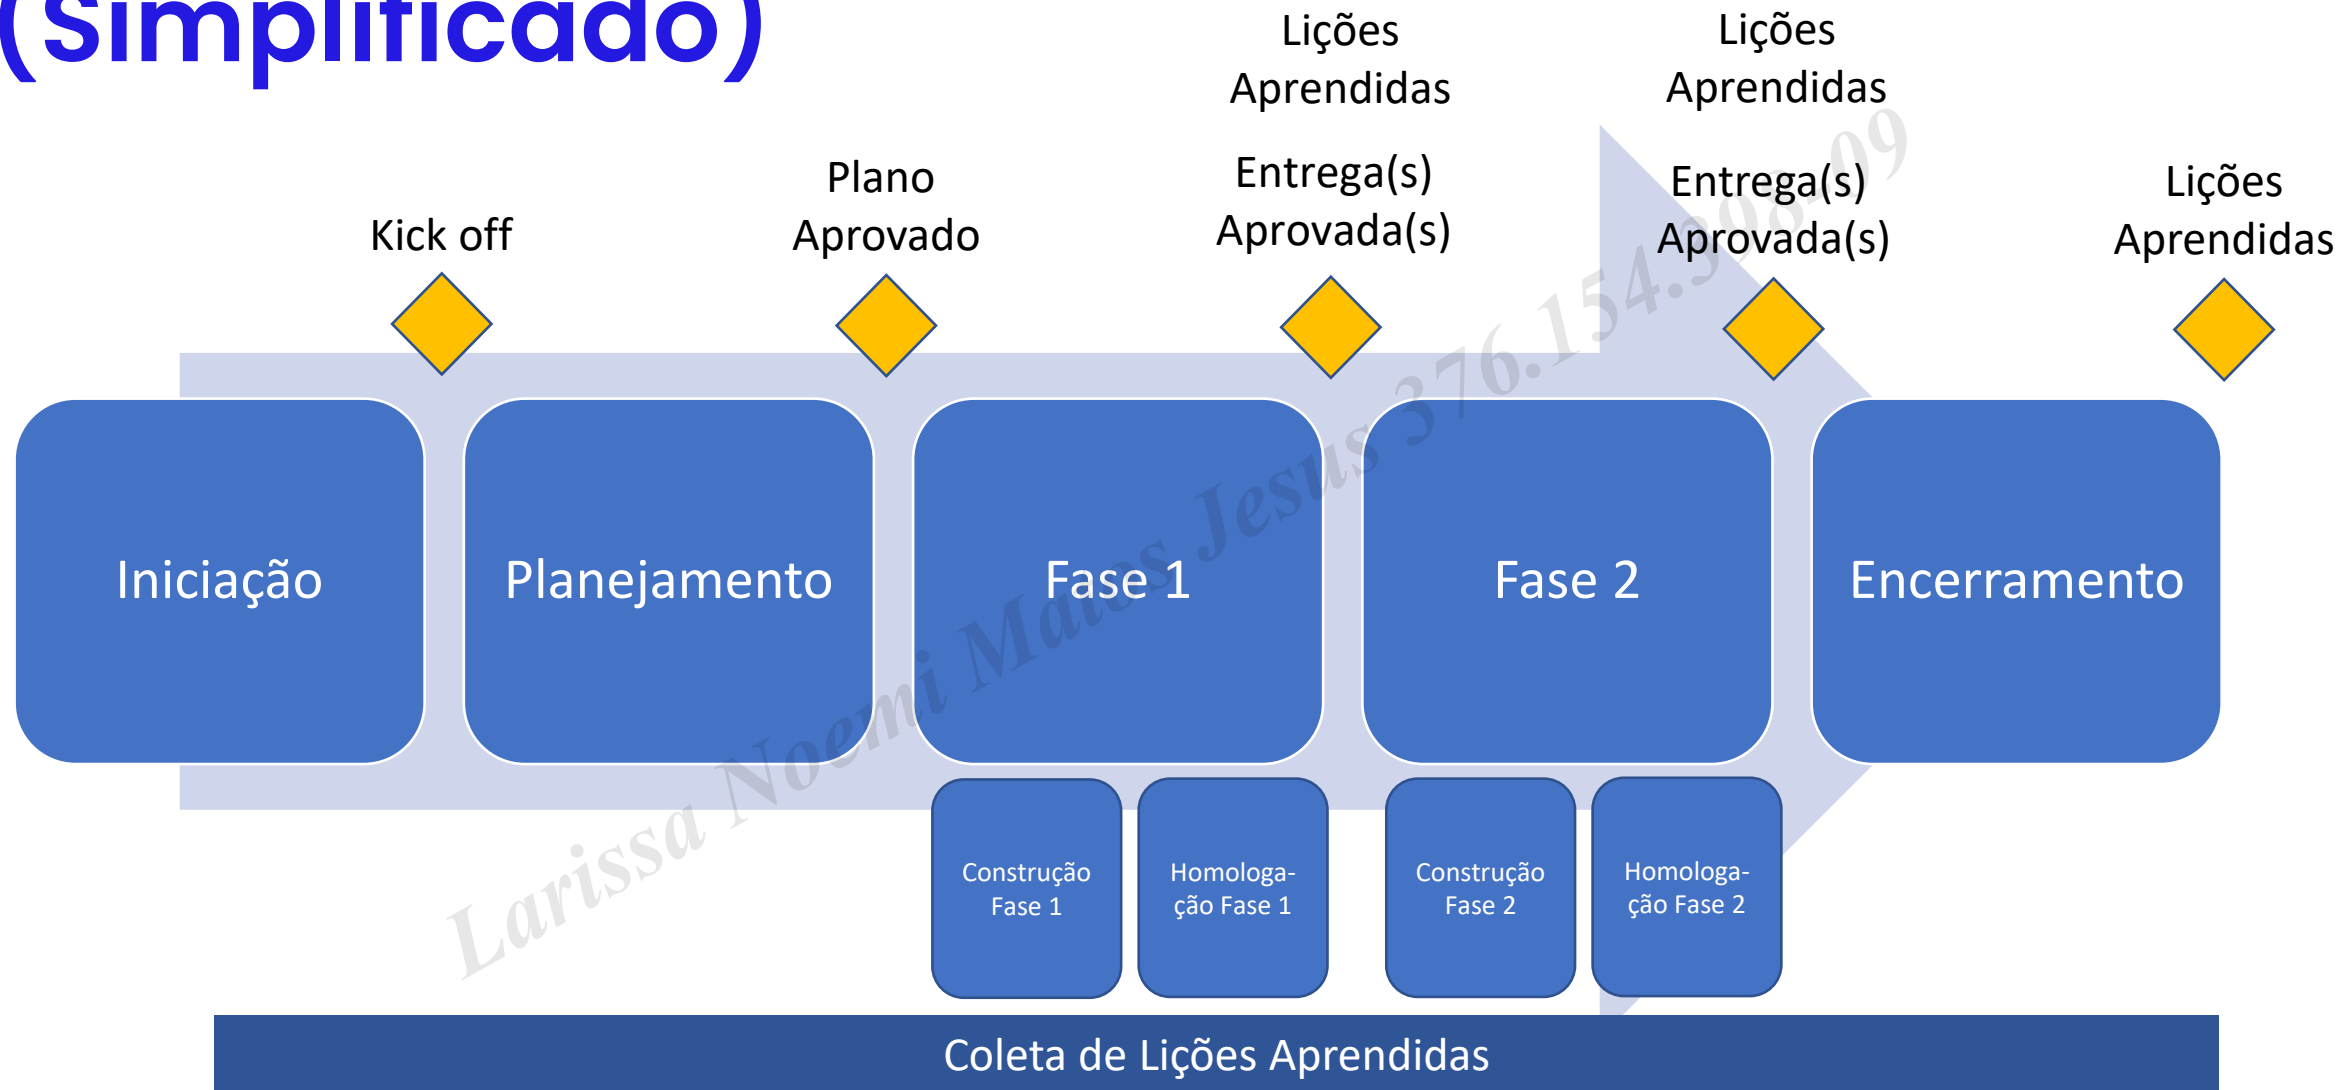

Visão Geral de Projeto Faseado ou Iterativo (Simplificado) Para qualquer abordagem



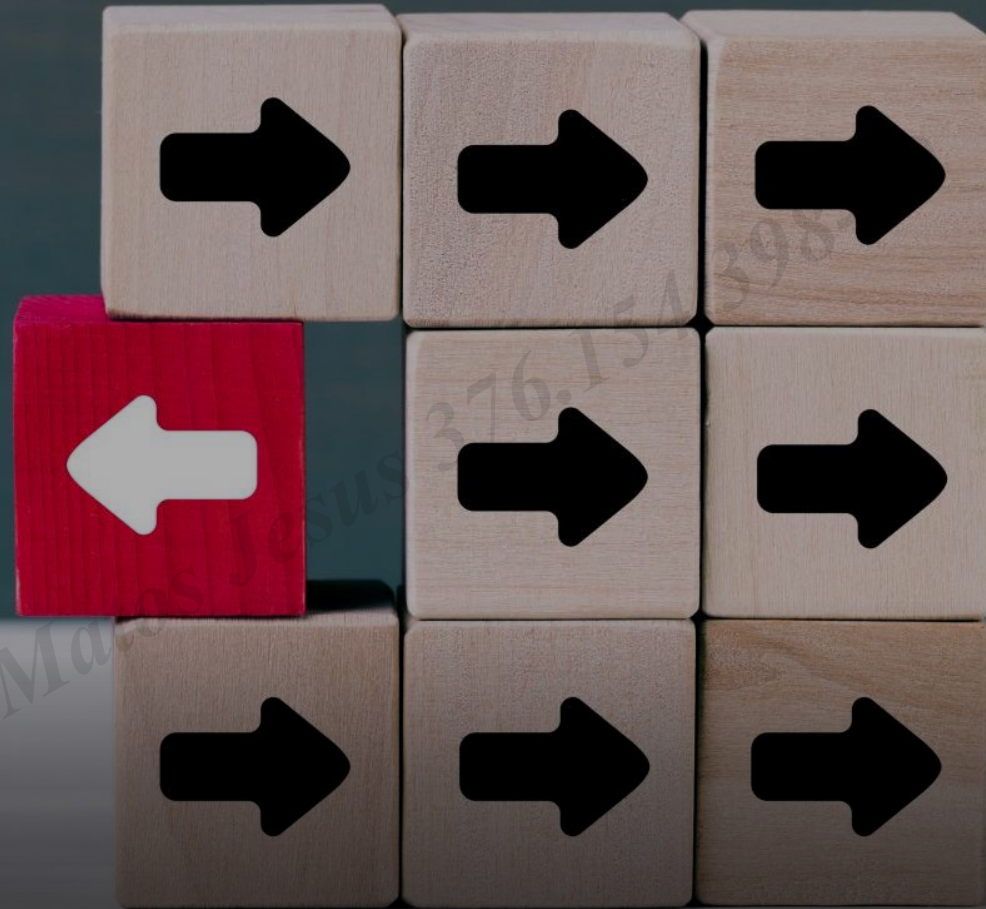

Gestão de Mudanças



As linhas de base de medição de desempenho – Escopo, Cronograma e Custos – precisam ser atualizadas quando há impacto por mudanças aprovadas por este processo.



As linhas de base devem estar atualizadas a partir do momento em que inicia a sua implementação

Após implementar uma mudança, o desempenho anterior deve ser medido com as linhas de base antes da atualização.



(Guia PMBOK®, 2017)

“ Comitê de Controle de Mudanças (CCM): grupo formalmente constituído para revisar, avaliar, aprovar, adiar ou rejeitar mudanças no projeto, e registrar e comunicar tais decisões.

Algumas mudanças podem requerer a aprovação do cliente, se ele não fizer parte do CCM.

(Guia PMBOK®, 2017)



Ação corretiva:

Orientação documentada para que o trabalho do projeto seja executado de modo que seu desempenho futuro esperado fique de acordo com o plano de gerenciamento.



(Guia PMBOK®, 2017)



Ação preventiva:

Uma orientação documentada para a realização de uma atividade que pode reduzir a probabilidade de consequências negativas associadas aos riscos do projeto.

(Guia PMBOK®, 2017)

Reparo de defeito:

A identificação documentada formalmente de um defeito em um componente do projeto com a recomendação para reparar o defeito ou substituir completamente o componente.



(Guia PMBOK®, 2017)

Carlos está gerenciando um projeto e um dos técnicos da equipe percebe que os requisitos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento do projeto não estão sendo atendidos. Será necessário um upgrade e a aquisição de novos equipamentos. O orçamento do projeto não prevê esse custo adicional. O que Carlos deveria fazer na sequência?



- A. Consultar o patrocinador e o cliente do projeto sobre o tema, solicitando a eles que entrem em contato com o departamento financeiro da empresa para solicitar um aporte no orçamento.
- B. Ir diretamente ao departamento financeiro e solicitar um aporte no orçamento do projeto.
- C. Providenciar a aquisição dos equipamentos e posteriormente solicitar ao patrocinador do projeto que aprove o aporte no orçamento.
- D. Solicitar ao técnico que especifique exatamente o que será necessário, formalizar uma solicitação de mudança e encaminhar para aprovação do comitê.

Autor: André Ricardi - Direitos Reservados

Carlos está gerenciando um projeto e um dos técnicos da equipe percebe que os requisitos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento do projeto não estão sendo atendidos. Será necessário um upgrade e a aquisição de novos equipamentos. O orçamento do projeto não prevê esse custo adicional. O que Carlos deveria fazer na sequência?


A. Consultar o patrocinador e o cliente do projeto sobre o tema, solicitando a

Resposta correta: D.

É essencial definir o que de fato será necessário, formalizar uma solicitação de mudança e submeter ao comitê. Entre as alternativas apresentadas esta seria a melhor decisão.

D. Solicitar ao técnico que especifique exatamente o que será necessário, formalizar uma solicitação de mudança e encaminhar para aprovação do comitê.

Autor: André Ricardi - Direitos Reservados

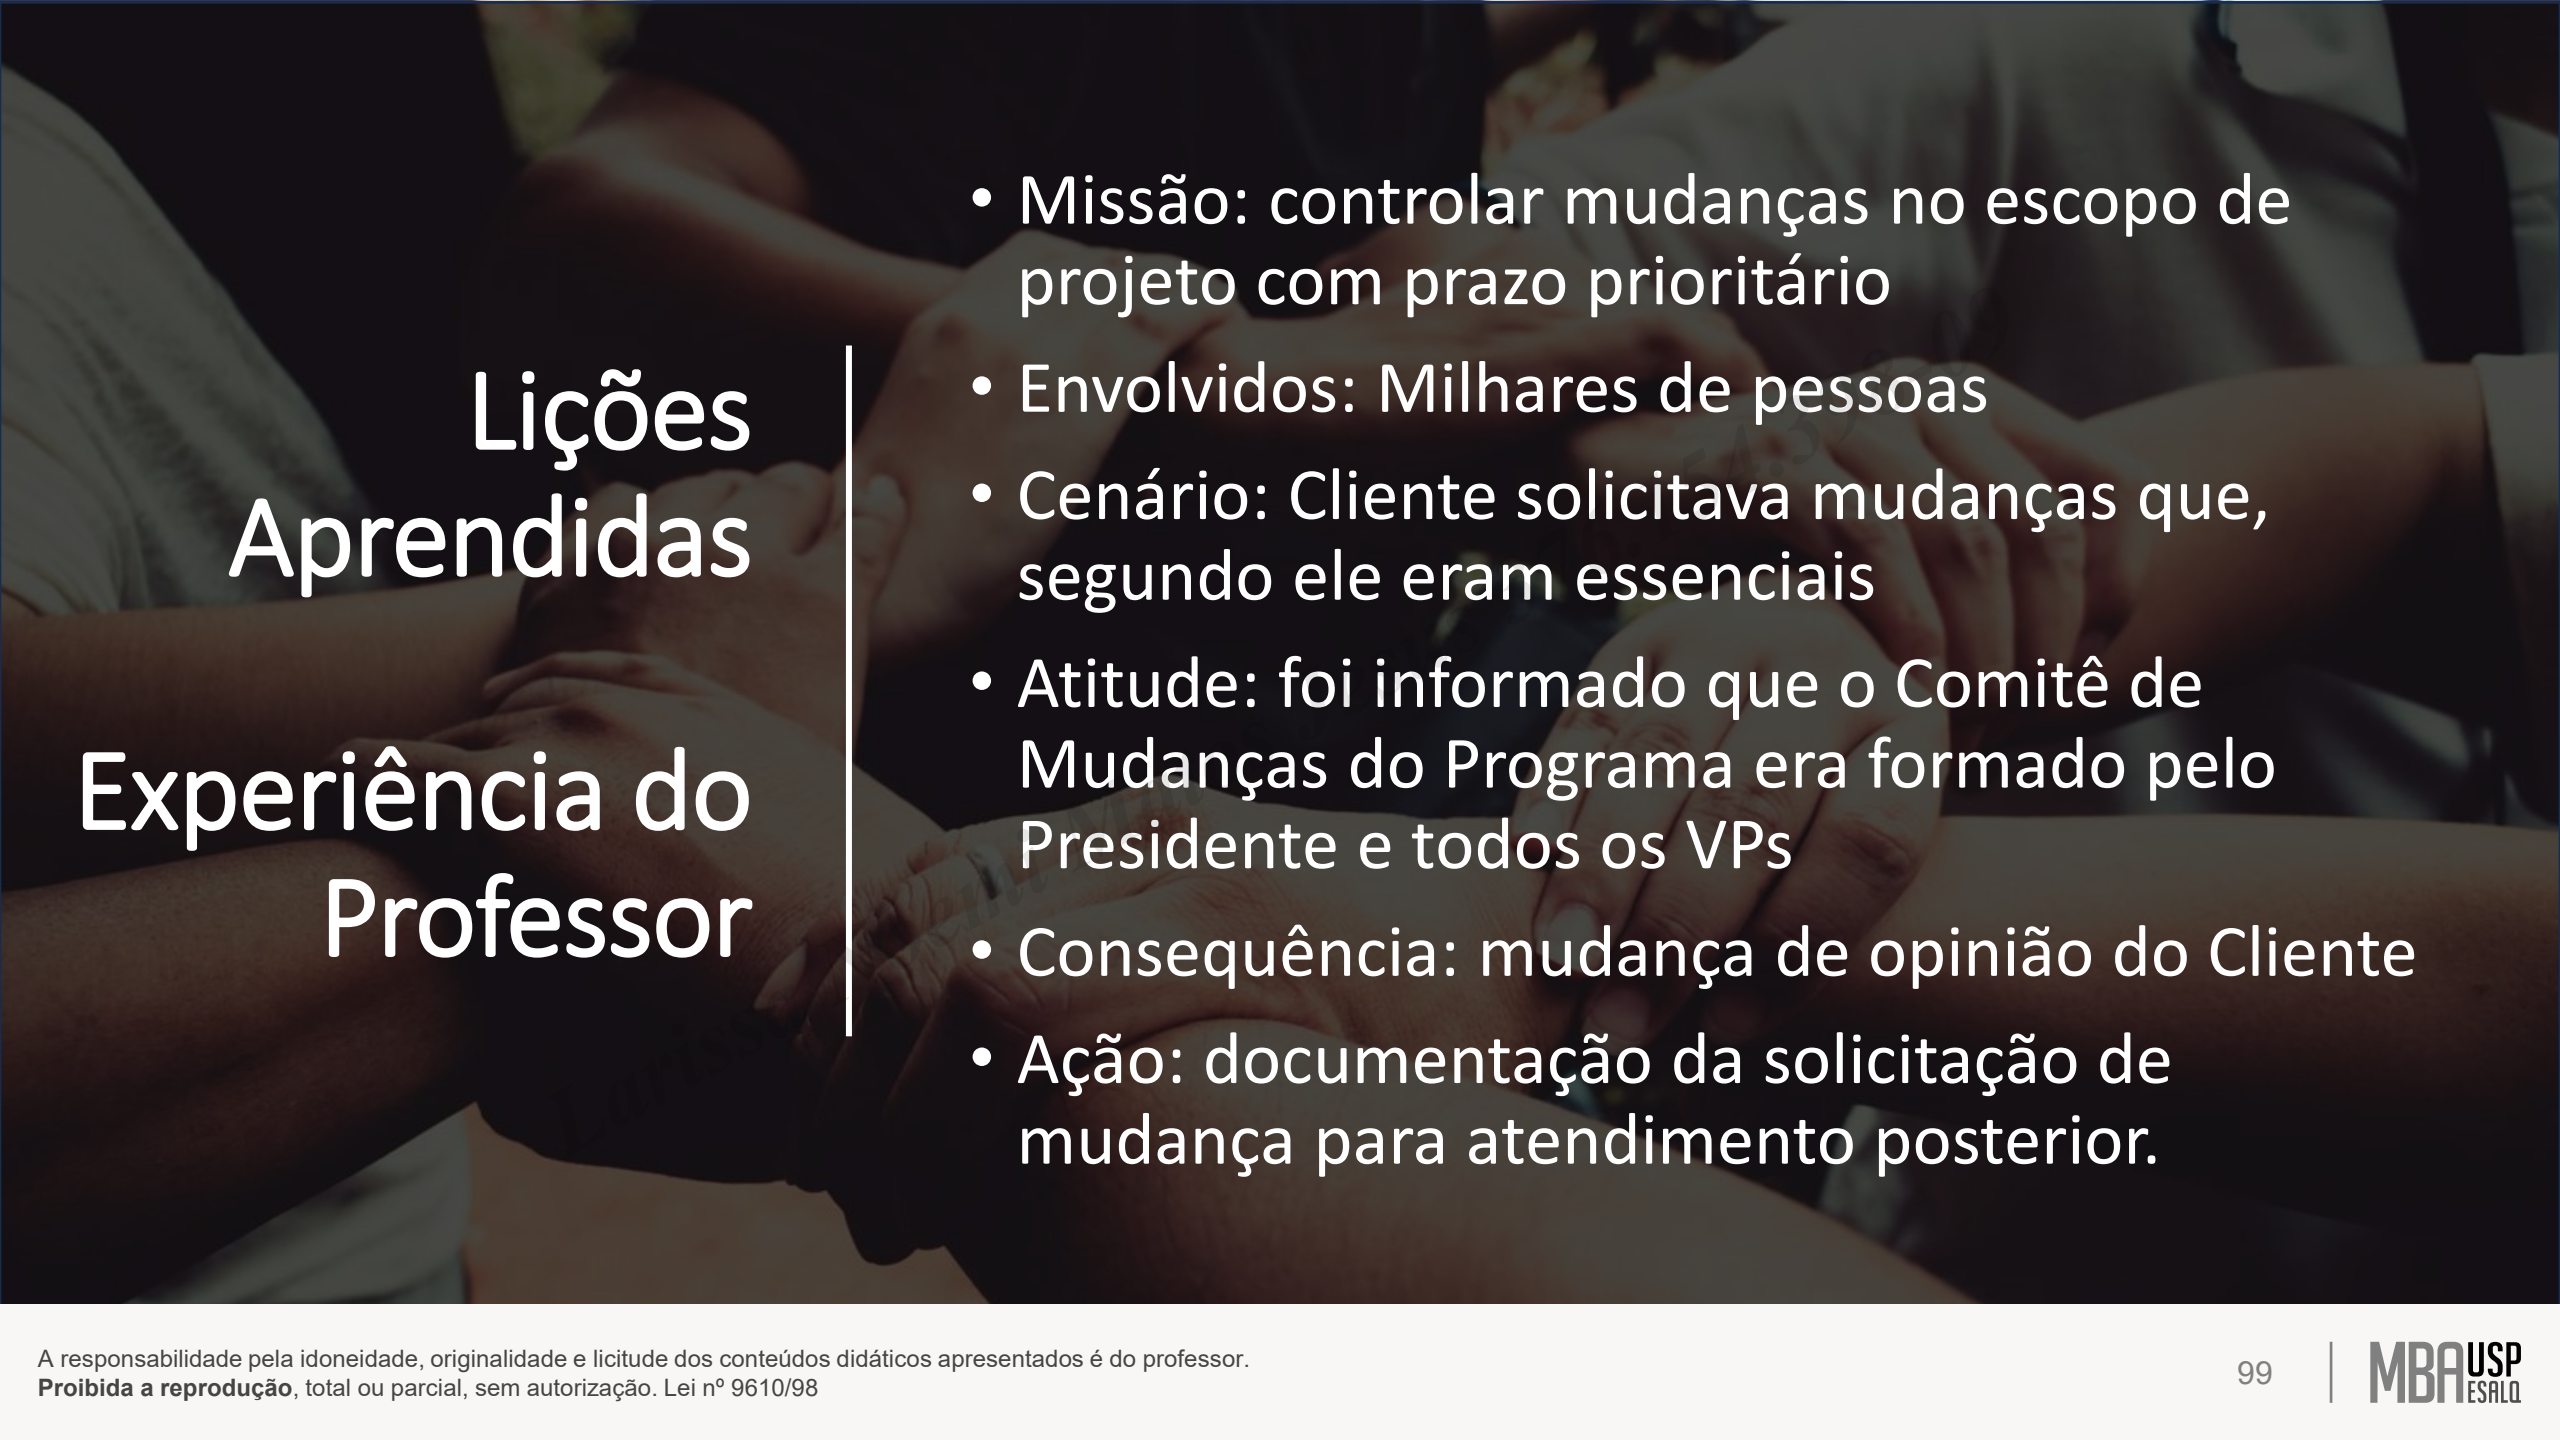

Lições Aprendidas

Experiência do Professor

- Missão: controlar mudanças no escopo de projeto com prazo prioritário
- Envolvidos: Milhares de pessoas
- Cenário: Cliente solicitava mudanças que, segundo ele eram essenciais
- Atitude: foi informado que o Comitê de Mudanças do Programa era formado pelo Presidente e todos os VPs
- Consequência: mudança de opinião do Cliente
- Ação: documentação da solicitação de mudança para atendimento posterior.



Gestão do Conhecimento

Conhecimento é comumente dividido em explícito (facilmente codificado) e tácito (pessoal e difícil de expressar).

Gerenciamento do conhecimento envolve ambos, e tem duas finalidades: reutilização e criação de conhecimentos.

Principais atividades que sustentam estas duas finalidades: compartilhamento e integração.

(Guia PMBOK®, 2017)



CONHECIMENTO

TÁCITO (IMPLÍCITO)

Opinião especializada
Know-how

Fatores ambientais da empresa
Cultura organizacional

DOCUMENTADO (EXPLÍCITO)

Ativos de processos organizacionais
Metodologia (presente) +
Registros e lições (passado)

Fatores ambientais da empresa
Padrões, normas, políticas, leis
da empresa ou do segmento

Fonte: OLIVEIRA, Armando. Capotar é preciso: Gestão de projetos com Amyr Klink. Cia das Letras, 2020.

Gerenciamento do conhecimento envolve garantir que as habilidades, experiências e expertise da equipe do projeto e de outras partes interessadas sejam utilizados antes, durante e depois do projeto



(Guia PMBOK®, 2017)

Importante criar uma atmosfera de confiança para que as pessoas sejam motivadas a compartilhar seus conhecimentos.

Ferramentas não criam esta atmosfera, mas as pessoas envolvidas sim.

(Guia PMBOK®, 2017)



Lições Aprendidas

Experiência do Professor

- Missão: responder e-mail do principal gestor do produto
- Envolvidos: 20 pessoas
- Cenário: Cliente questionando porque determinado assunto estava sendo tratado daquela forma
- Atitude: pesquisa na documentação e aprovação formal e envio ao cliente
- Consequência: mudança de atitude do Cliente a partir de então
- Ação: o Cliente é o dono do projeto, e não o gerente do projeto. É o Cliente que define o que precisa ser feito, e tudo deve ser documentado e aprovado.




<https://www.pmi.org/about/awards/winners/past-award/project-of-the-year/e190-e2-program-development>

The background of the slide features a close-up, slightly blurred image of a car's instrument cluster. It includes a speedometer with a red needle pointing towards the 100 km/h mark, a temperature gauge with a red needle pointing towards the 130°C mark, and a digital display showing '10.2' in red. The gauges have white markings and numbers on a dark background.

Monitoramento e Controle

Indicadores: painel de instrumentos do carro

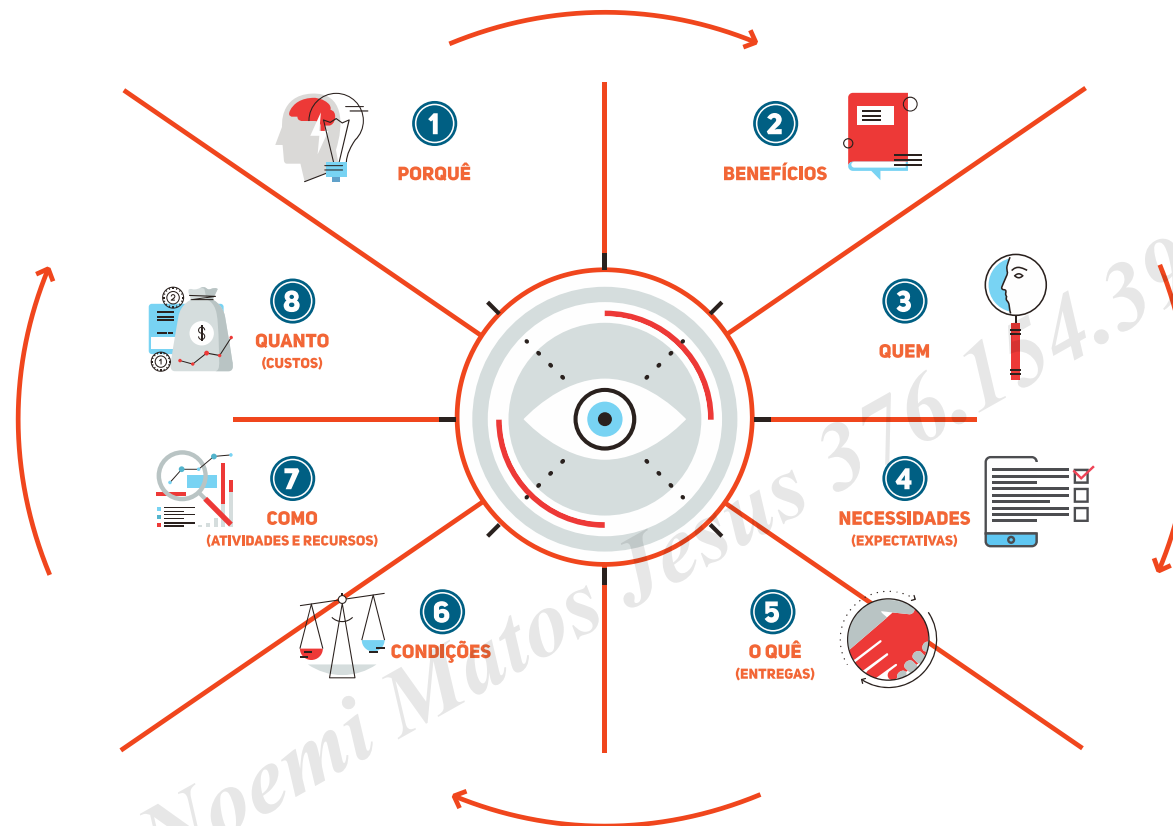

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

ANDRÉ RICARDI
GUILHERME XAVIER



<https://app.mural.co/template/1ef6893a-e8aa-4717-b267-d6dad66ee2e5/64c6b7af-a762-415c-88b3-4a34088eb07e>

https://miro.com/app/board/o9J_ki-m1OE=/?share_link_id=303590763298

<https://www.youtube.com/channel/UCor-Z0lOsCHNjWi5DjjC6sg/>

The screenshot displays the YouTube channel page for 'Easy Life Canvas', which has 62 subscribers. The channel banner features an illustration of a person in a suit sitting in a chair and using a tablet, with a red background. Below the banner, a grid of six circular icons represents various project management topics: 'UM EVENTO FAMILIAR, COMO UMA FESTA OU CASAMENTO', 'UMA VIAGEM', 'A REFORMA DE SUA CASA', 'UMA DIETA OU REEDUCAÇÃO ALIMENTAR', 'CARRO NOVO', and 'A AQUISIÇÃO DE SUA CASA PRÓPRIA'. The channel's navigation tabs include 'INÍCIO', 'VÍDEOS', 'PLAYLISTS', 'CANAIS', 'DISCUSSÃO', and 'SOBRE'. The 'VÍDEOS' tab is active, showing a playlist of four videos, all titled 'Easy Life Canvas Online'. The first video is 'Vídeo 01' (9:19), followed by 'Vídeo 02' (9:19), 'Vídeo 03' (8:57), and 'Vídeo 04' (8:40). The channel's name 'Easy Life Canvas' is prominently displayed in the center, with the 'EASY LIFE' logo to its left. The left sidebar shows the standard YouTube navigation menu, including 'Início', 'Em alta', 'Inscrições', 'Biblioteca', 'Histórico', 'Seus vídeos', 'Assistir mais tarde', 'Vídeos marcados com "Gostei"', and 'Mostrar mais'. The bottom of the screenshot shows the URL: 'https://www.youtube.com/playlist?list=LL5wWi3vna5NwJ9KQ_Q1_VQA'.



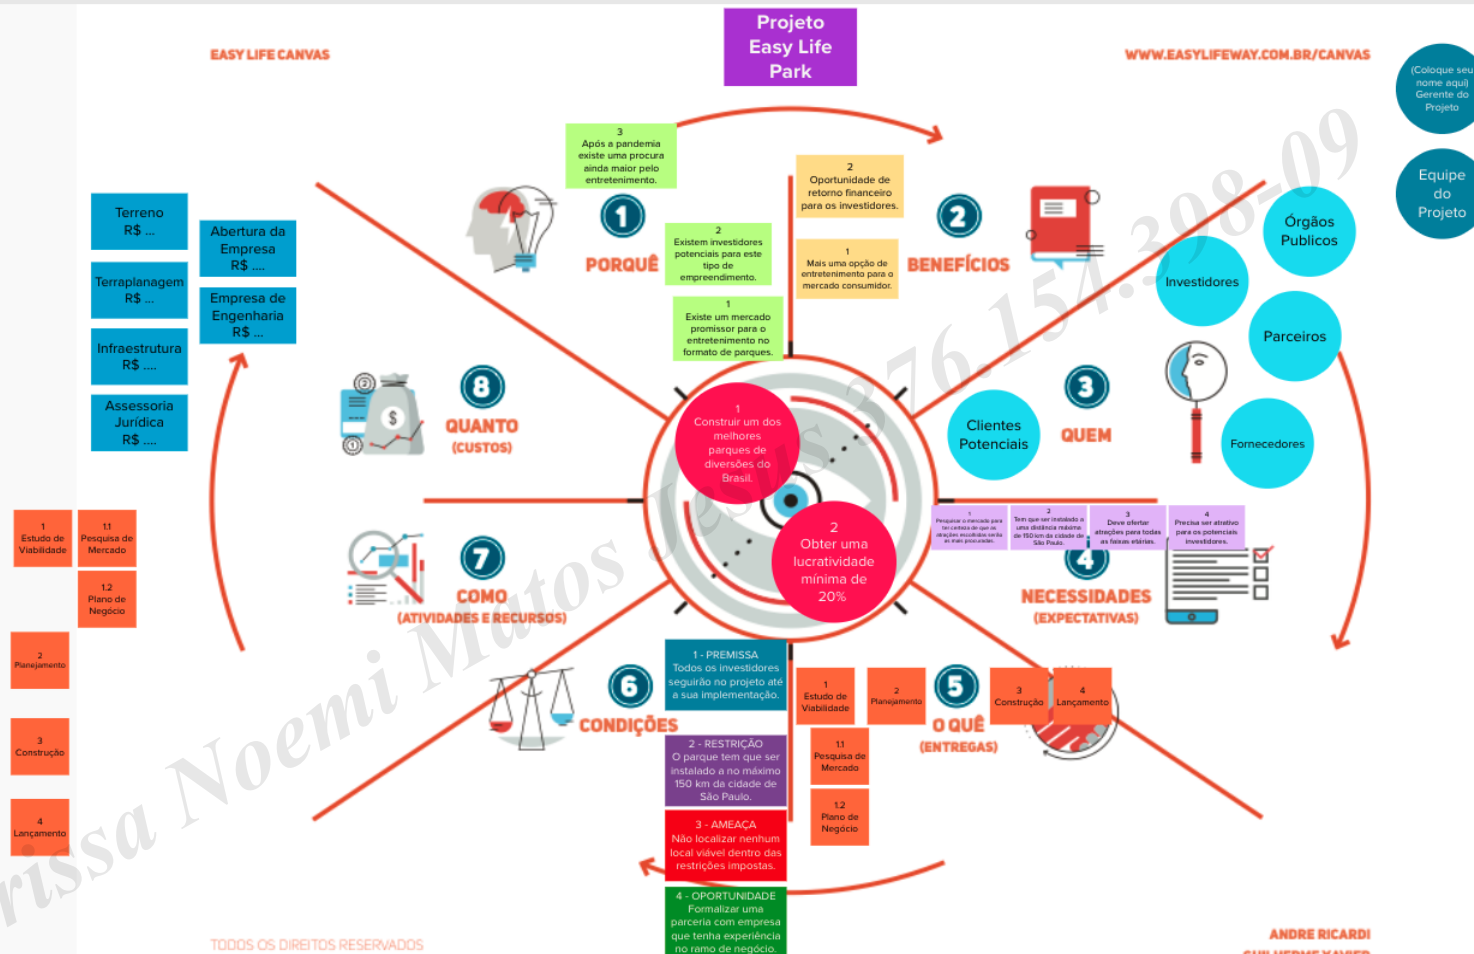

André Ricardi

ANDRE RICARDI
GUILHERME XAVIER

110

ALGUNS CAMINHOS POSSÍVEIS ROADMAP



André (easybok.com.br) | eas de trabalho | Recente | Marcado como favorito | Templates | Criar

Gestão Híbrida de Projetos - Modelo GRATUITO Versão 2024 | Público | Quadro

Power-up do Calendário | Power-Ups | Automação | Filtros | Compartilhar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

||| Clique aqui para saber como utilizar este modelo em seus projetos

Sobre o autor: André Ricardi

+ Adicionar um cartão

1 - EASY LIFE CANVAS | Técnica & Ferramenta para Concepção Inicial e Planejamento do Projeto

||| Easy Life Canvas

Defina o(s) objetivo(s) do projeto. Objetivo é o que deve ser atingido ao final do projeto, ou em outras palavras, importante para o sucesso do projeto.

Objetivos

1 PORQUÊ

Quais são as justificativas para que o projeto seja executado? Por que se deve ou se precisa executar este projeto?

1 - Porquê

2 BENEFÍCIOS

Quais são os benefícios que se espera conseguir entregando o que será prometido? O que os clientes ou participantes deste projeto terão como valor entregue por este projeto?

2 - Benefícios

+ Adicionar um cartão

2 - Painel de Controle

||| Painel de Controle do Projeto

GOVERNANÇA DO PROJETO

VISÃO COMUM

ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO E ENTREGA

CICLO DE VIDA DO PROJETO

PARTES INTERESSADAS

EQUIPE

PROCESSOS

MEDIÇÃO

MÉTODOS

ARTEFATOS

+ Adicionar um cartão

Questões

||| Questões

Modelo cartão para Questões

+ Adicionar um cartão

Entregas/Atividades | ou | Backlog de Projeto

Modelo cartão Entregas / Tarefas | (nome) (score)

+ Adicionar um cartão

A Ser Feito | ou | Backlog da Sprint Atual

||| A ser feito

+ Adicionar um cartão

Sobre este quadro

Administradores de Quadro

André Ricardi
@andrericardi
Editar informações de perfil

Descrição | Editar

Este é um modelo de Quadro para gerenciamento de projetos utilizando como referência uma abordagem Híbrida, Adaptativa ou Preditiva, tendo por base o Guia PMBOK® 7ª edição, publicado pelo PMI® em 2021. Também utiliza como referência a 6ª edição do mesmo Guia PMBOK®, publicada juntamente com o Guia Ágil em 2017.

Ele foi criado visando auxiliar aos colegas que participam de projetos e gostariam de um template. Também serve para quem quiser aprender ou já esteja estudando gestão de projetos.

Uma explicação em vídeo poderá ser encontrada em breve no youtube, no [canal]
[André Ricardi | Gestão de Projetos Prática & IA](#)



<https://trello.com/b/LnJw5tem/%E2%9C%85-gest%C3%A3o-h%C3%ADbrida-de-projetos-modelo-gratuito-vers%C3%A3o-2024>

← → ↺ 🏠 📄 youtube.com/@AndreRicardi/playlists

YouTube BR

Pesquisar

🏠 Início

📺 Shorts

📁 Inscrições

Você >

📺 Seu canal

🕒 Histórico

📁 Playlists

📺 Seus vídeos

🕒 Assistir mais tarde

👍 Vídeos com "Gostei"

📺 André Ricardi || Gestão de Projetos Prática & IA

@AndreRicardi · 856 inscritos · 65 vídeos

- Inteligência Artificial apoiando a gestão pessoal e profissional de projetos. ...mais

[linkedin.com/in/andré-ricardi-pmp](https://www.linkedin.com/in/andré-ricardi-pmp) e mais 3 links

Personalizar o canal Gerenciar vídeos

Início Vídeos Shorts Ao vivo Playlists Comunidade 🔍

Inscrições

- National Geogra... (0)
- HISTORY (0)
- Fundação Vanzolini
- Sancier Miranda | L...
- Mario Trentim - ...
- FLEKS Model

Playlists criadas

Ordenar por

AI TIPS

Ver playlist completa

Jornada ChatGPT & Inteligência Artificial...

Ver playlist completa

ChatGPT

Ver playlist completa

PRINCE 2

Ver playlist completa

Gestão Ágil e Híbrida

Ver playlist completa

Easy PMP®

Ver playlist completa

<https://www.youtube.com/@AndreRicardi/playlists>



Pesquisar

ChatGPT & INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA PRÁTICA | CURSO GRATUITO | EasyBOK® AI | Vídeo 01

André Ricardi | Gestão de Projetos Prática & ...

Analytics Editar vídeo

34 Compartilhar Promover Download

Jornada ChatGPT & Inteligência Arti...

André Ricardi | Gestão de Projetos Prática & IA - 1 / 3

- ChatGPT & INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA... André Ricardi | Gestão de Projetos ... 8:44
- ChatGPT & INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA... André Ricardi | Gestão de Projetos ... 10:54
- ChatGPT & INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA... André Ricardi | Gestão de Projetos ... 8:20

O replay do chat está desativado para esta estreia.

Todos De André Ricardi | Gestão de ... Intel...

- ChatGPT & INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA... André Ricardi | Gestão de Projetos ... 245 visualizações · há 10 meses
- Yes - Awaken (Live at Montreux Jazz Festival 2003) Montreux Jazz Festival 4,4 mi de visualizações · há 11 anos
- 2025 Triumph Trident 660 Triple Tribute walk-around and quick... Ramblerbound 11 mil visualizações · há 2 meses
- Música para o Trabalho - Deen

Lar » Explorar

Inteligência Artificial em Gestão de Projetos

PMIxAI: sua porta de entrada para o futuro do gerenciamento de projetos baseado em IA

Através do PMIxAI, o PMI está liderando a transformação da IA no gerenciamento de projetos, mesclando a engenhosidade humana com os avanços da IA, alimentados e guiados por nossa comunidade global.

Junte-se a nós!



Opinião

Insights e liderança inovadora

<https://www.pmi.org/explore/ai-in-project-management>

Será que é possível
aplicar tudo isso para
nossos projetos
profissionais e
pessoais...

...e termos uma vida
mais fácil e menos
sofrida?





Bônus de Vida ...

Que tal nos conectarmos via LinkedIn?



Bibliografia e Indicações



- PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)-a. **Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) 7ª e 8ª edições.** Pensilvânia: Project Management Institute, 2017 e 2021.



- PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)-a. **Grupos de Processo: um Guia de Prática.** Pensilvânia: Project Management Institute, 2023.



- PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)-a. **Guia Ágil. 1ª edição.** Pensilvânia: Project Management Institute, 2017.



- RICARDI, A.L.F. **Easy Life: Tire as ideias da gaveta gerenciando projetos pessoais e profissionais com facilidade.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.



- OLIVEIRA, A. **Capotar é Preciso : gestão de projetos com Amyr Klink / Armando Oliveira.** São Paulo: Portfólio-Penguin, 2020.



- SHINODA, C. **Propósito de vida: um guia prático para desenvolver o seu.** São Paulo: Benvirá, 2021.



Se você não
consegue resolver
sozinho,
peça ajuda “pro”
gordinho!

Obrigado!

André Ricardi, PMP, PMO-CP, AHPP | [linkedin.com/in/andr -ricardi-pmp](https://www.linkedin.com/in/andr -ricardi-pmp)

MBAUSP
ESALQ
